

名都借跨線橋道路拡幅改良事業

工事説明会




 流山市役所 土木部 道路建設課
 東日本旅客鉄道株式会社
 エニオン建設株式会社


○説明の流れ

- 1.事業概要
- 2.現在までの工事進捗状況
- 3.工事の進め方について
- 4.今後の工事スケジュールについて
- 5.その他工事の詳細について
(騒音振動計、安全施設、交通規制に係る説明等)
- 6.側道整備について


1. 事業概要

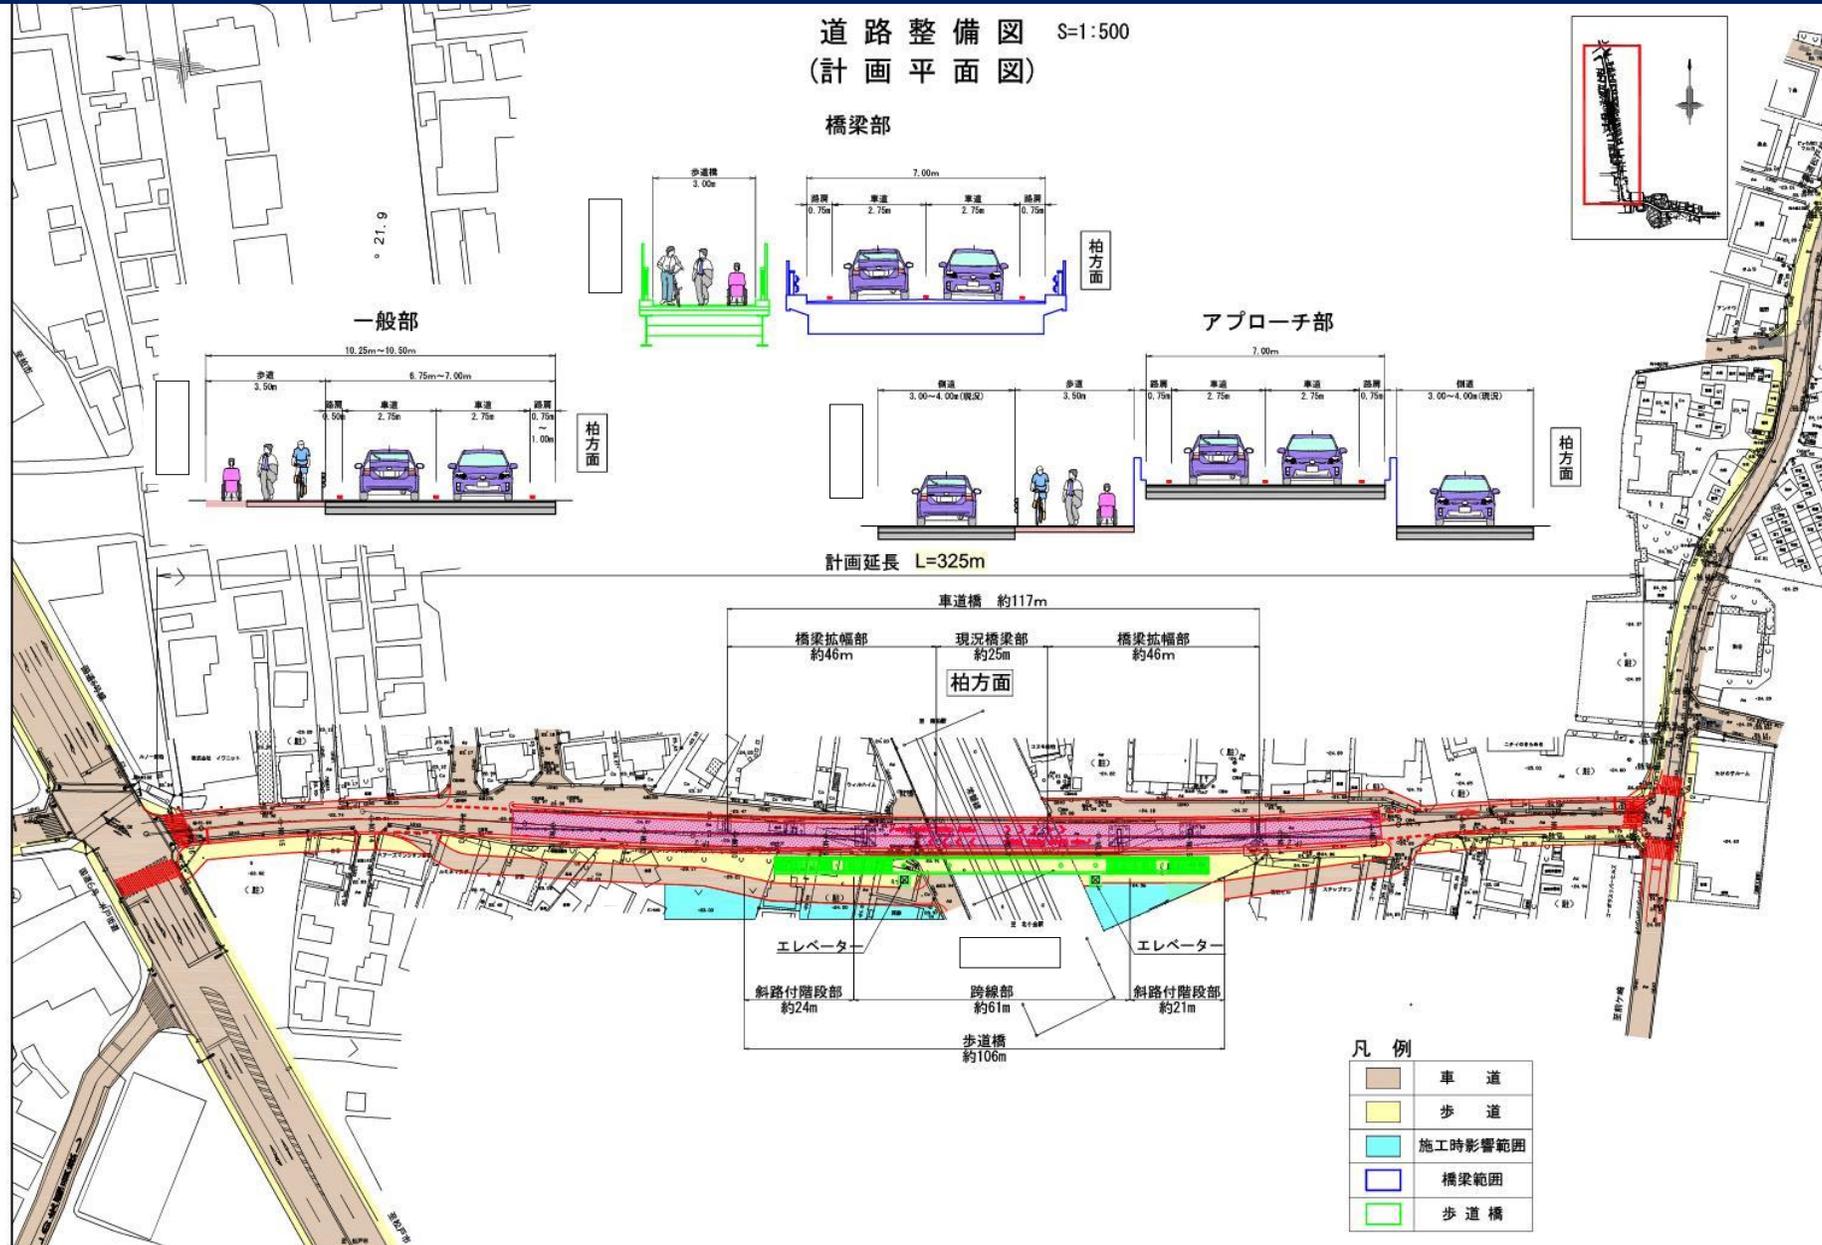

2. 現在までの工事進捗状況

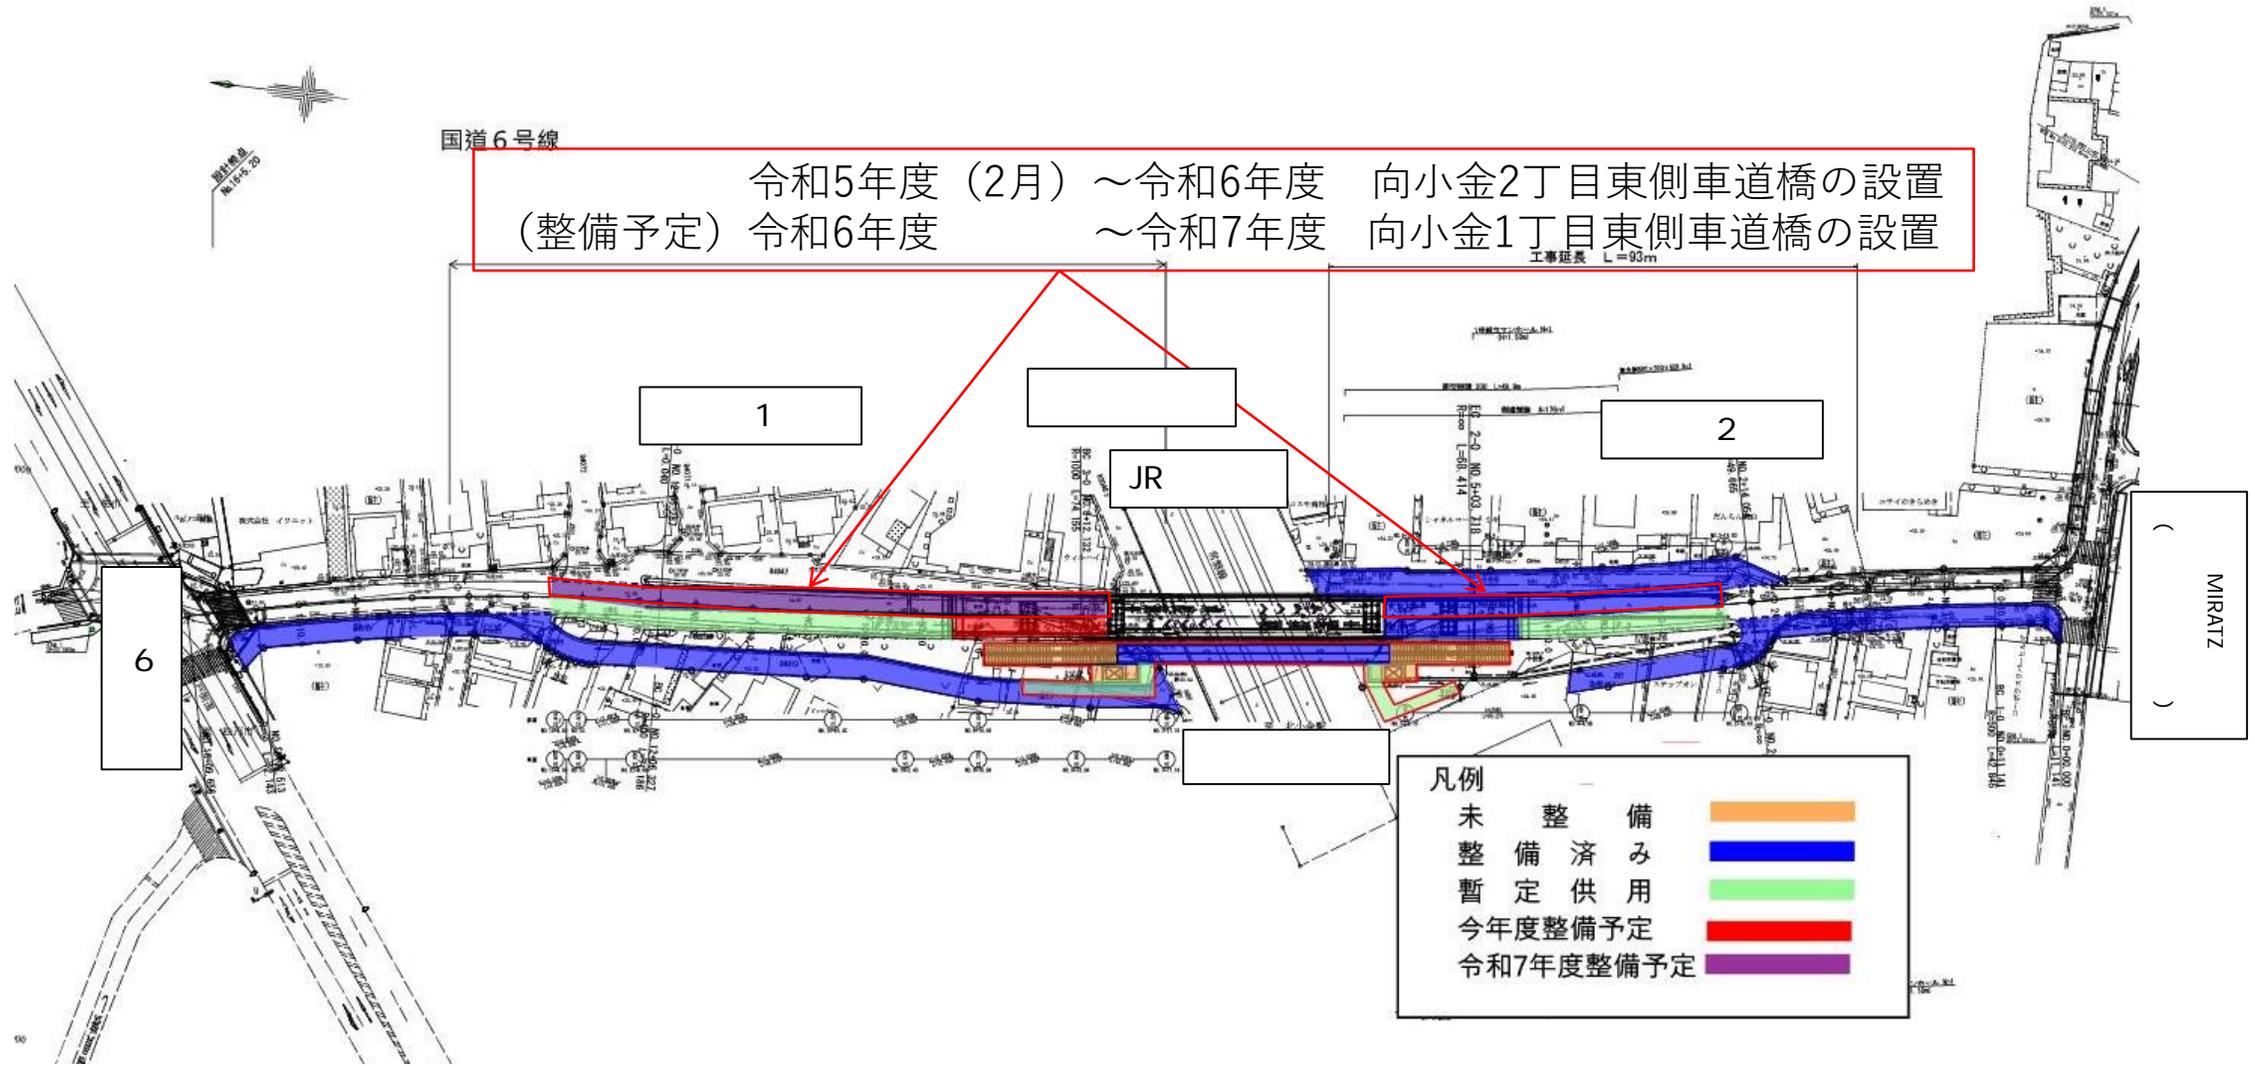




2. 現在までの工事進捗状況（歩道整備工事）

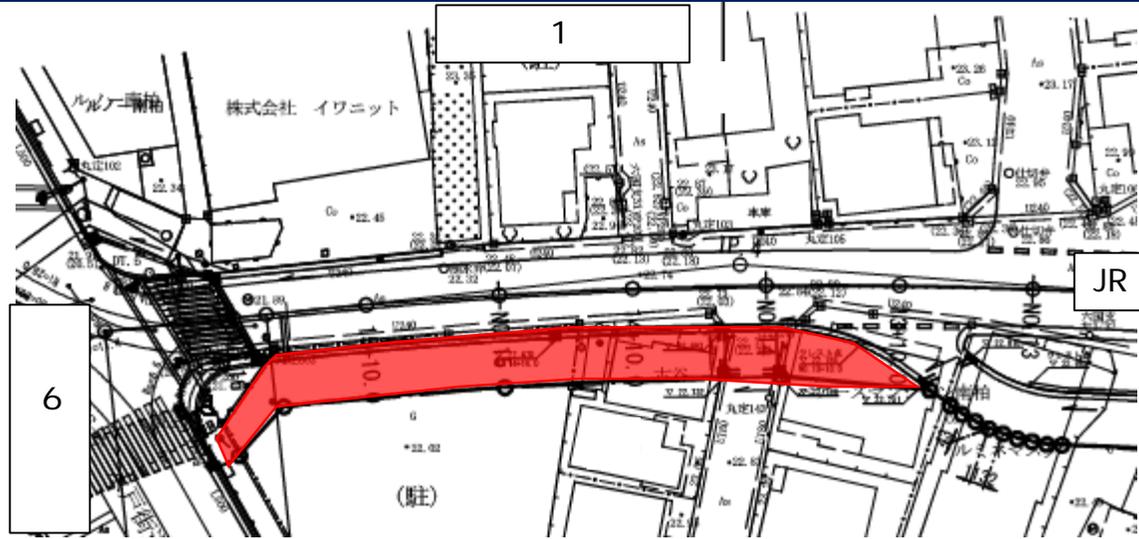



歩行者スペース
を確保



2. 現在までの工事進捗状況（歩道橋整備工事）

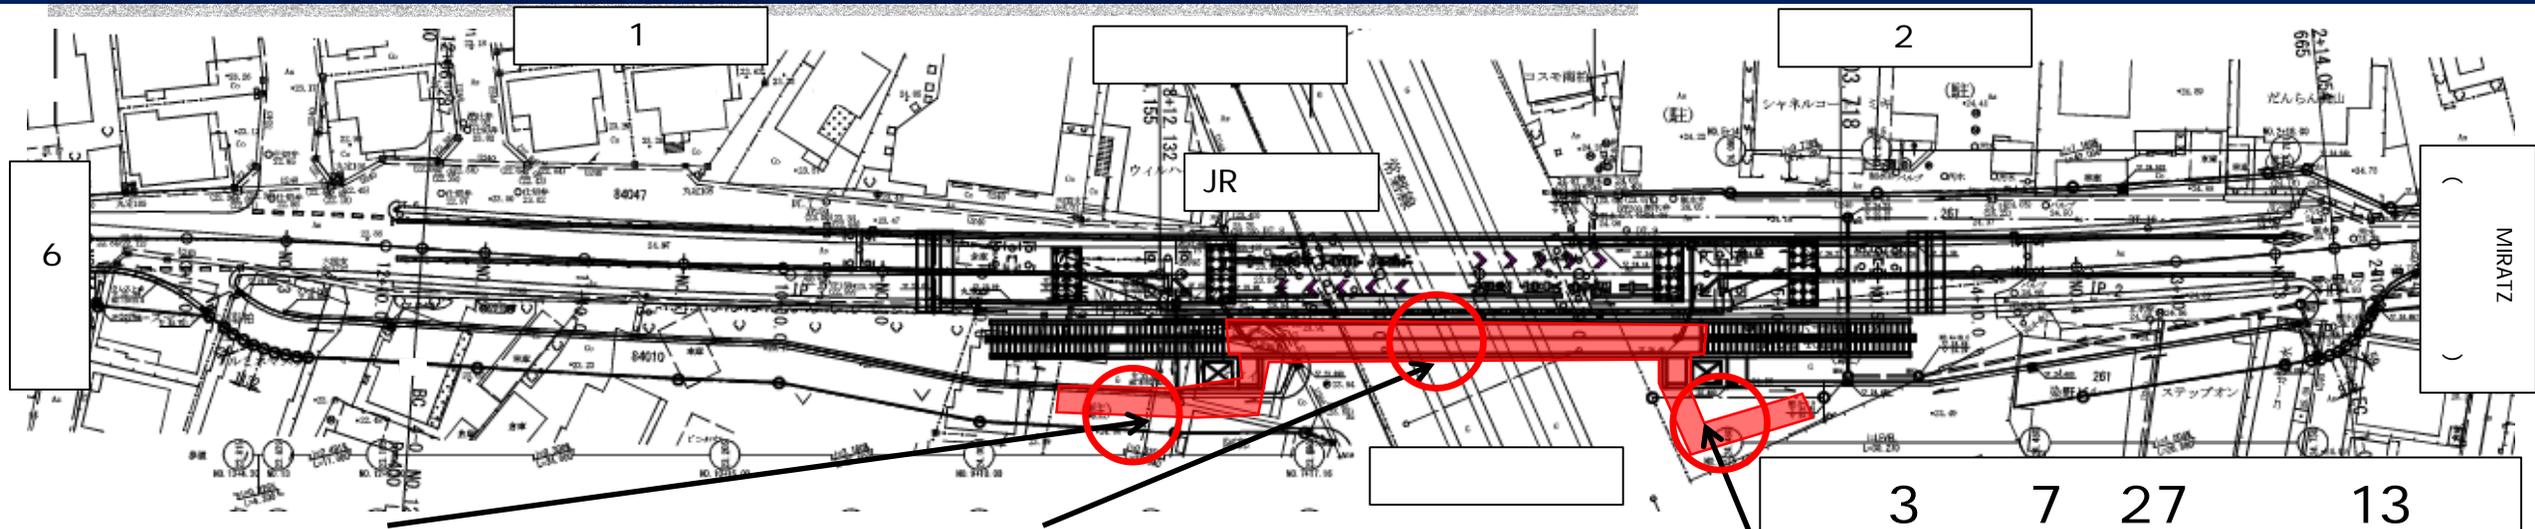

2. 現在までの工事進捗状況（車道橋整備工事）

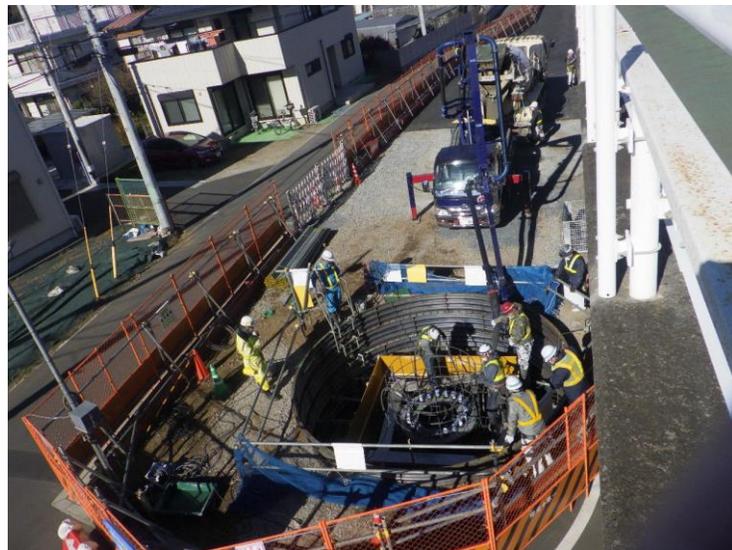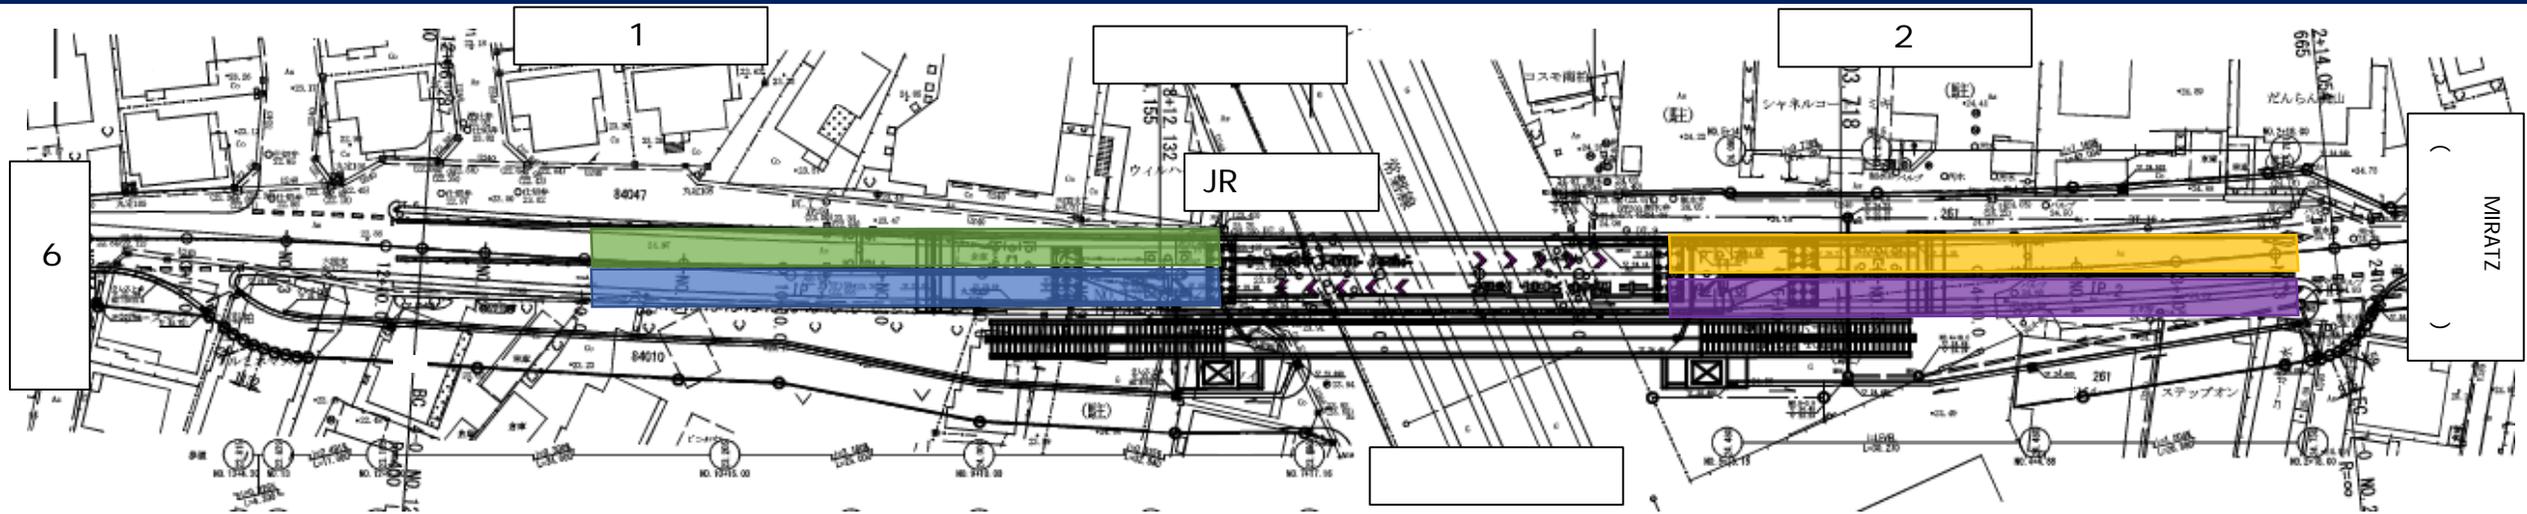


3. 工事の進め方について (安全対策)




4. 今後の工事スケジュールについて 工事施工箇所の移動に伴う工事用信号機位置の変更について

工事用信号機位置(変更前)



工事用信号機位置(変更予定)

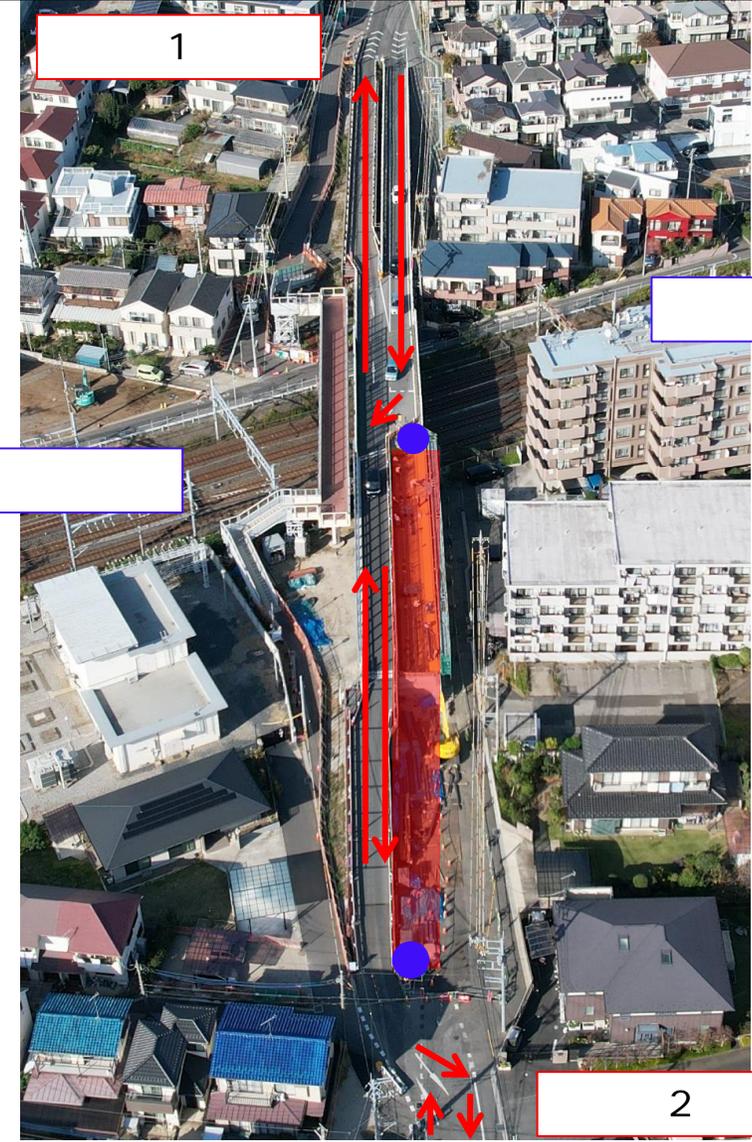

(

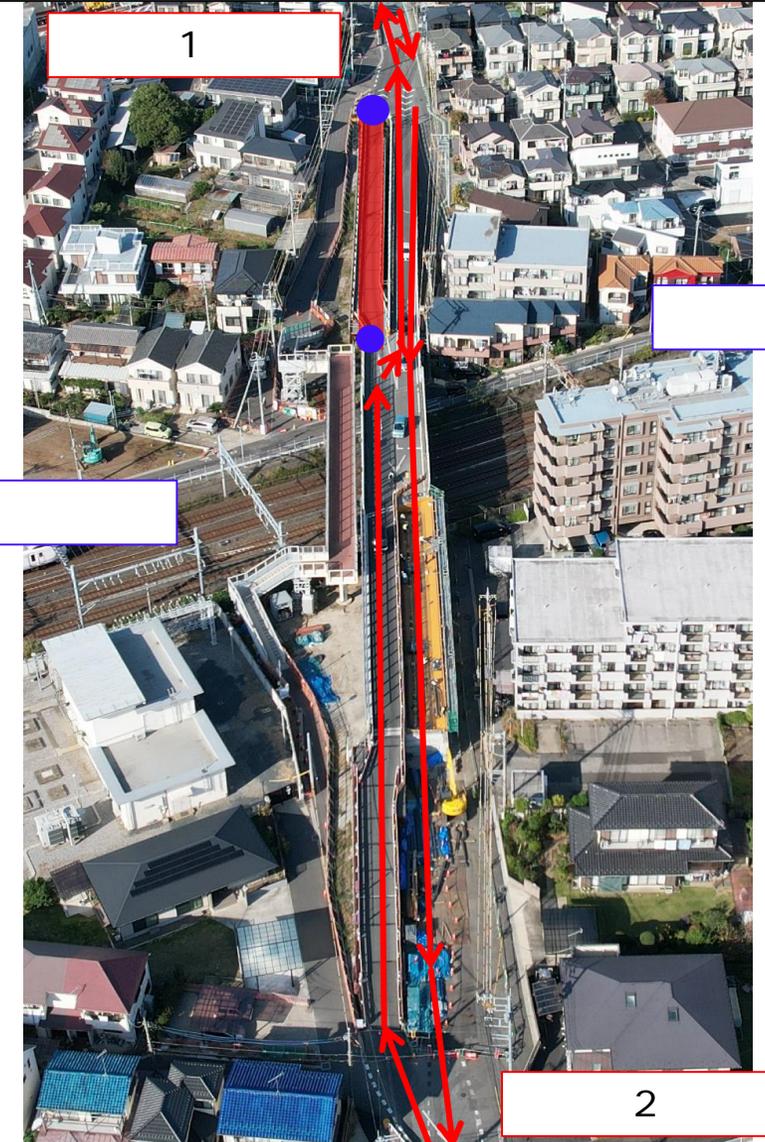

4. 今後の工事スケジュールについて 工事施工箇所の変更に伴う工事用信号機位置の変更について

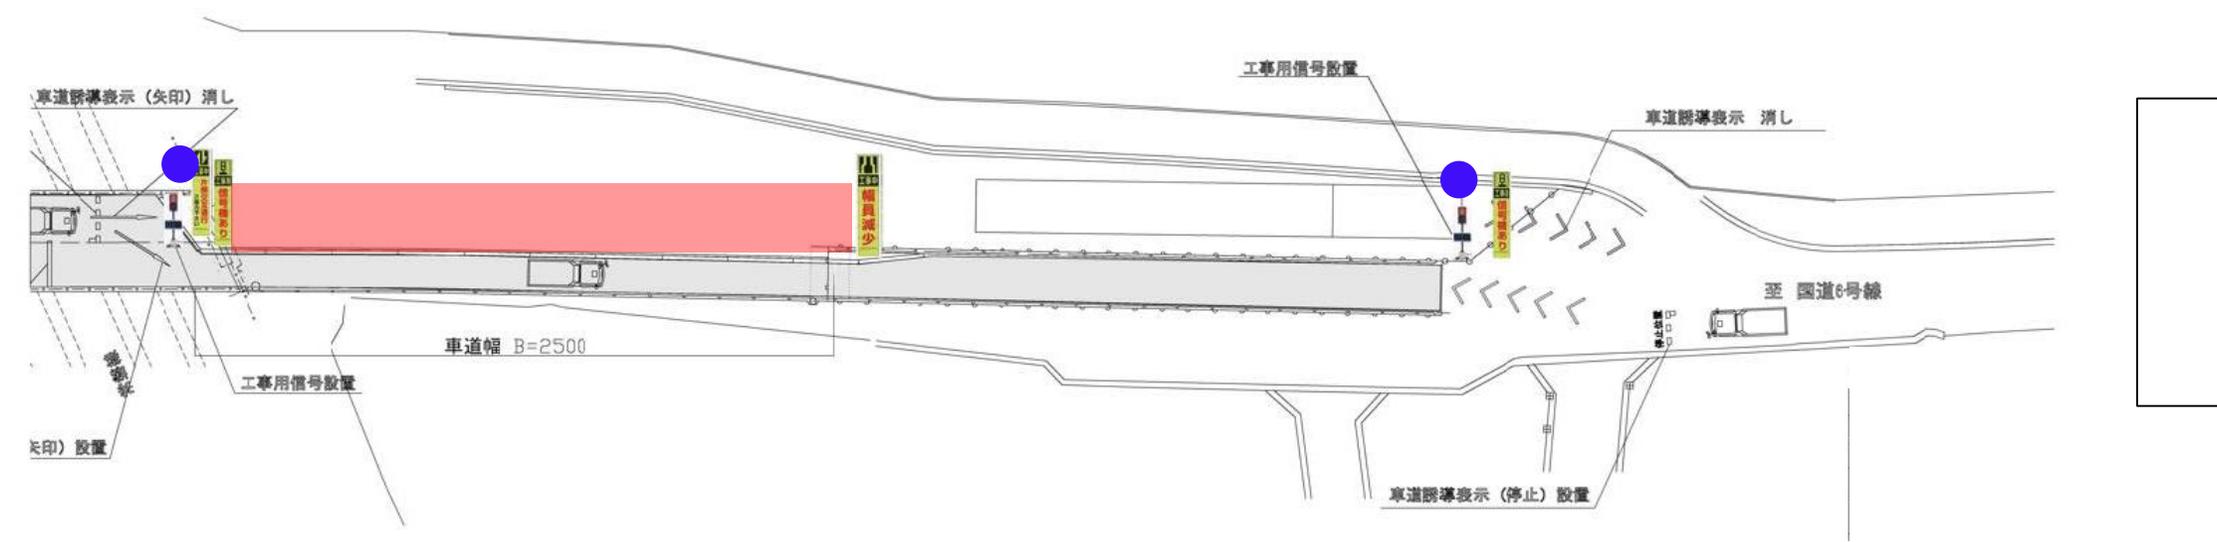
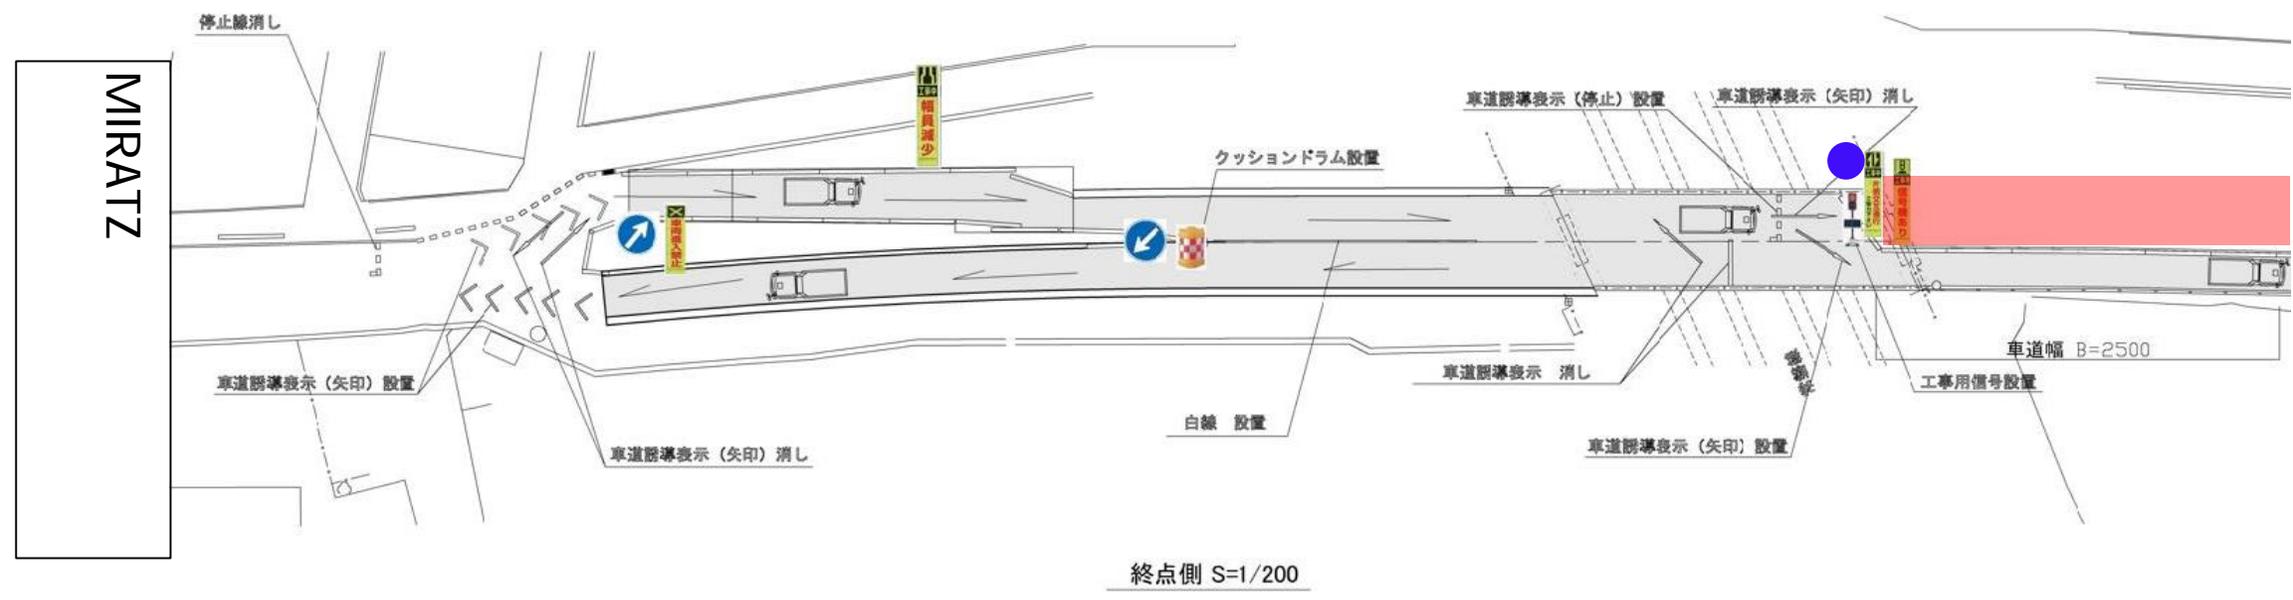


MIRATZ
()




5. その他工事の詳細について（施工手順）

ご線橋新設工事（1. 撤去工）



1. 撤去（切断）施工状況

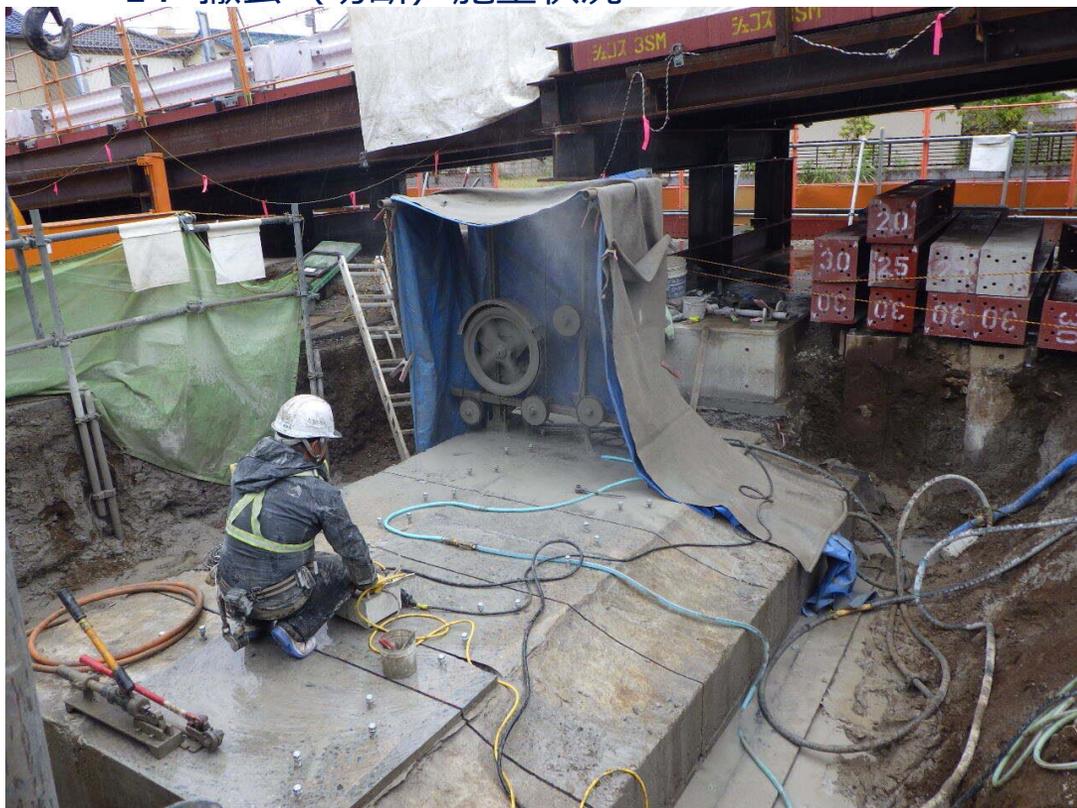


1. 撤去状況



5. その他工事の詳細について（施工手順）

ご線橋新設工事（2. 鋼管杭打設）

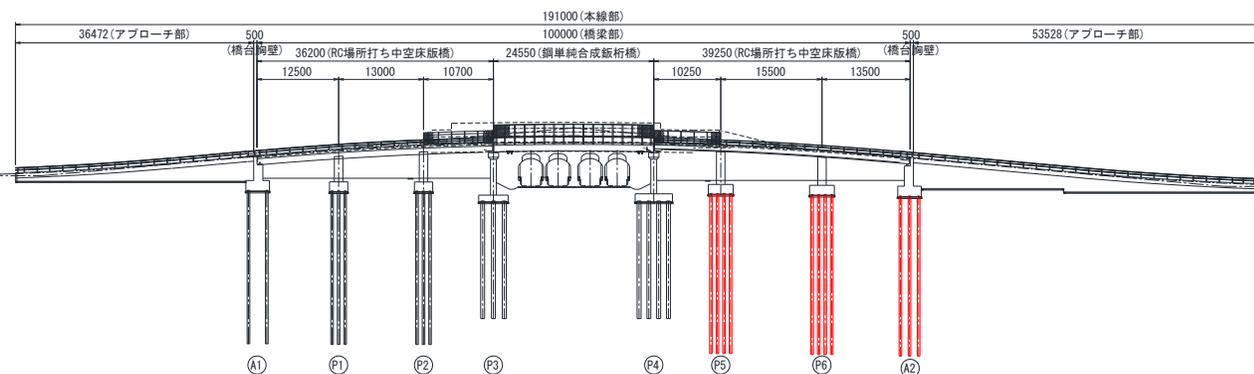

1. 鋼管杭打設イメージ




1. 鋼管杭打設状況



5. その他工事の詳細について（施工手順）

ご線橋新設工事（3. 下部工事）



①掘削



②均しコンクリート打設



③鉄筋組立



④型枠組立



⑤コンクリート打設




⑥コンクリート打設完了



5. その他工事の詳細について（施工手順）

こ線橋新設工事（4. 上部工事）



①柱型枠組立



②柱コンクリート打設



③型枠支保工組立



④スラブ型枠組立




⑤鉄筋組立



⑥コンクリート打設完了



5. その他工事の詳細について（工事用車両搬入経路）

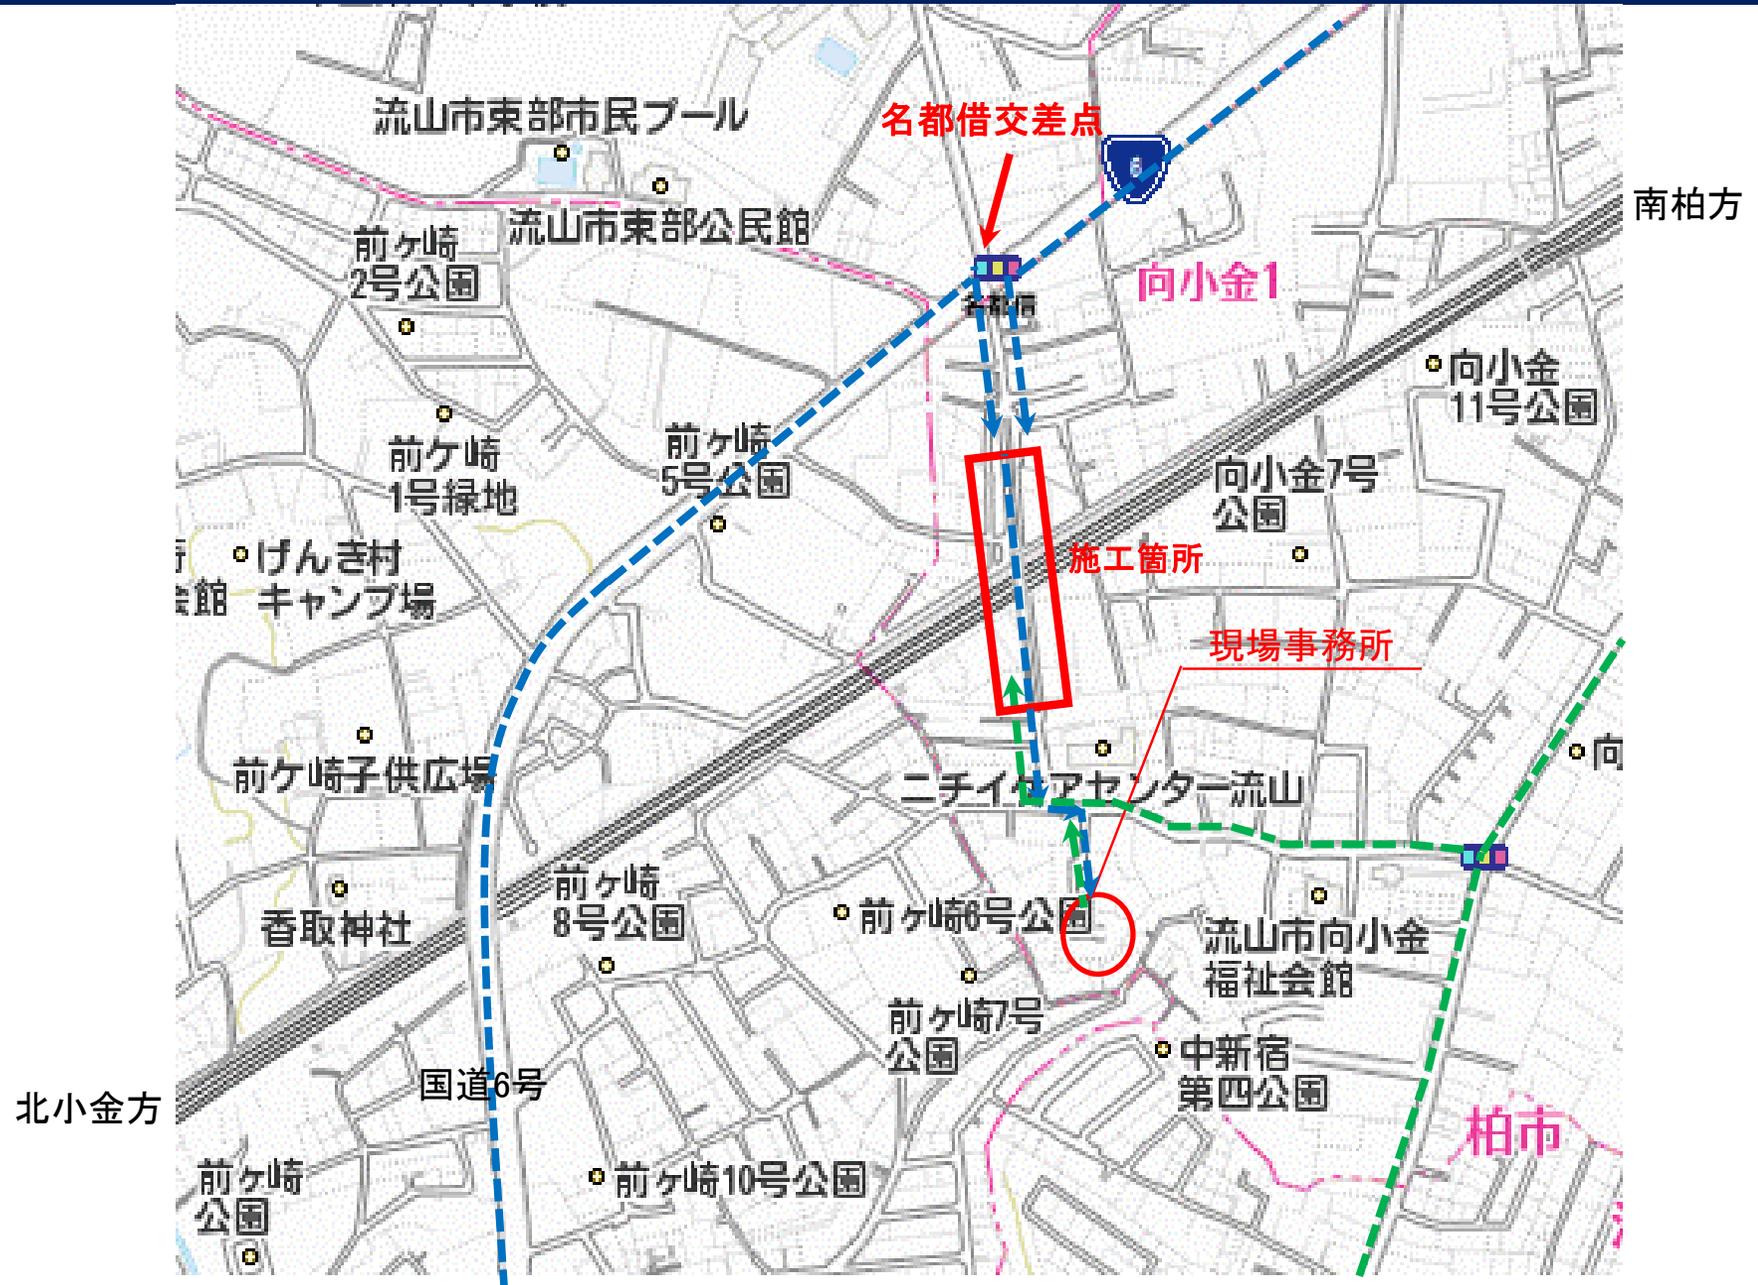

5. その他工事の詳細について（工事中のお願い）




②作業時間帯について

- ・作業時間帯：昼間8:00～18:00（音の出る作業は9:00～17:00）
夜間22:00～5:00
- ・線路上空や線路内での作業を一部夜間作業で計画をしております。
- ・騒音には、十分注意を払いますのでご協力をお願い致します。
- ・工程をできる限り短くするために土曜日・祝日の作業も計画をしております。

5. その他工事の詳細について（工事中のお願い）

【騒音・振動対策について】


- ・工事ヤード付近は、騒音・振動計を設置します。
- ・無駄な騒音・振動を最小限に抑えます。

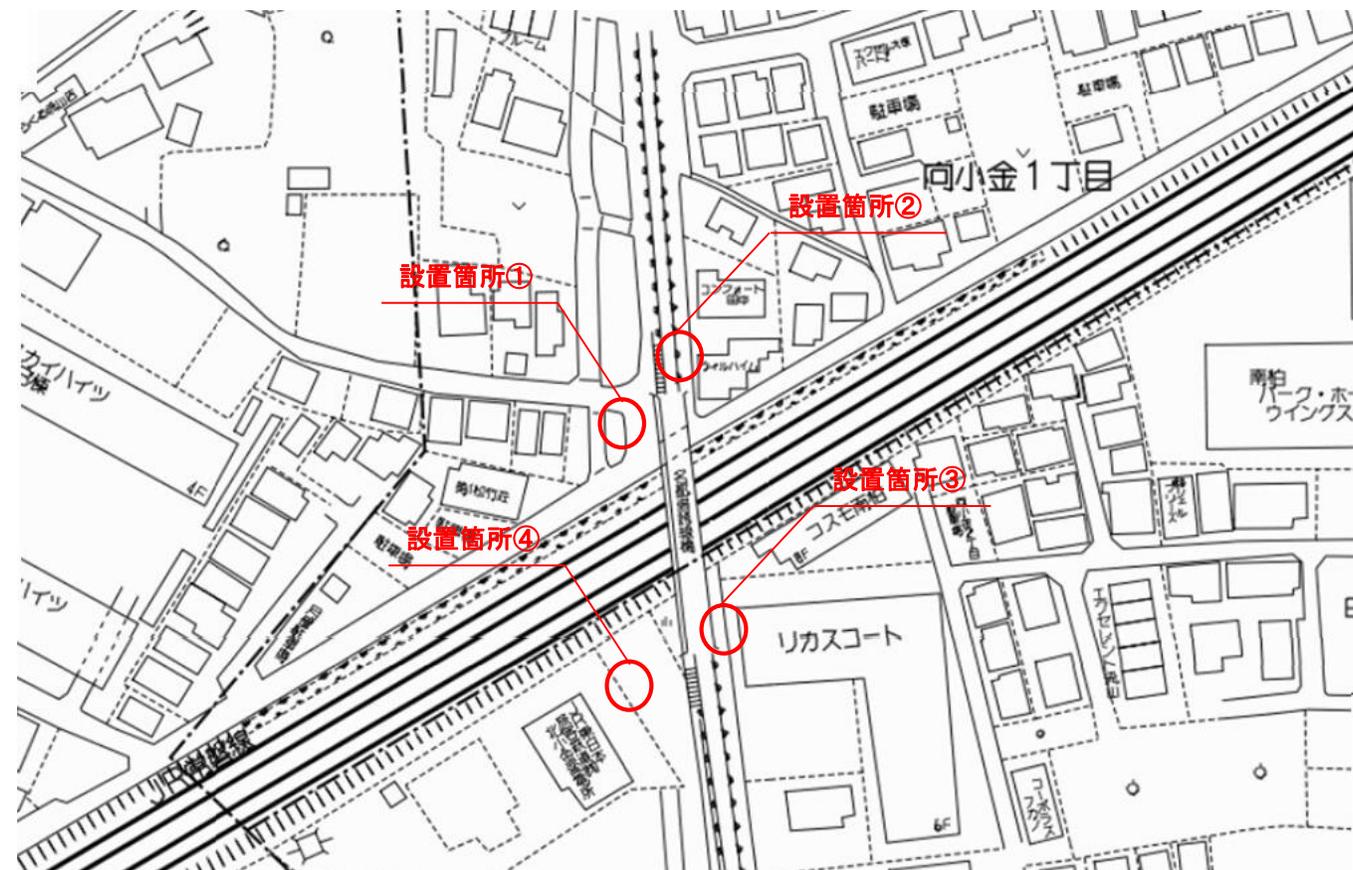

5. その他工事の詳細について（工事中のお願い）

【安全対策について】

- ・工事ヤード付近は、カラーコーンやポールで通行スペースを明確にします。
- ・工事ヤード内は、柵で囲います。

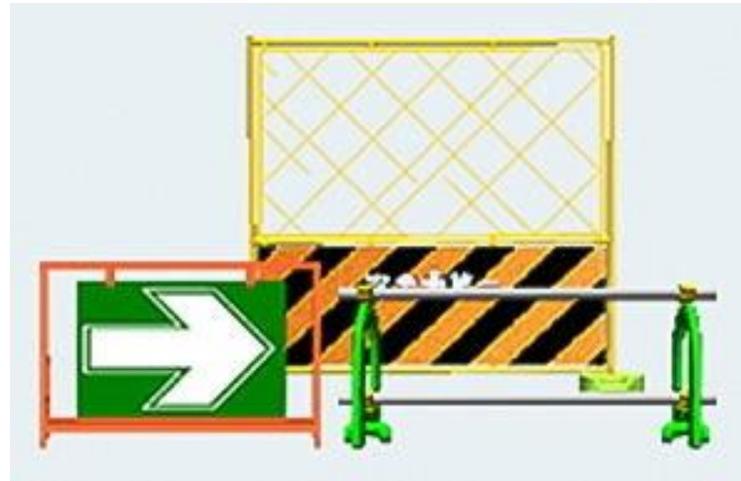

5. その他工事の詳細について（工事中のお願い）

③ 車道幅員減少について




- ・スロープ部分は、北小金側の半分を構築するために車道幅員が現在の3.5mから2.5mへと狭くなります。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

断面図

3500

2500

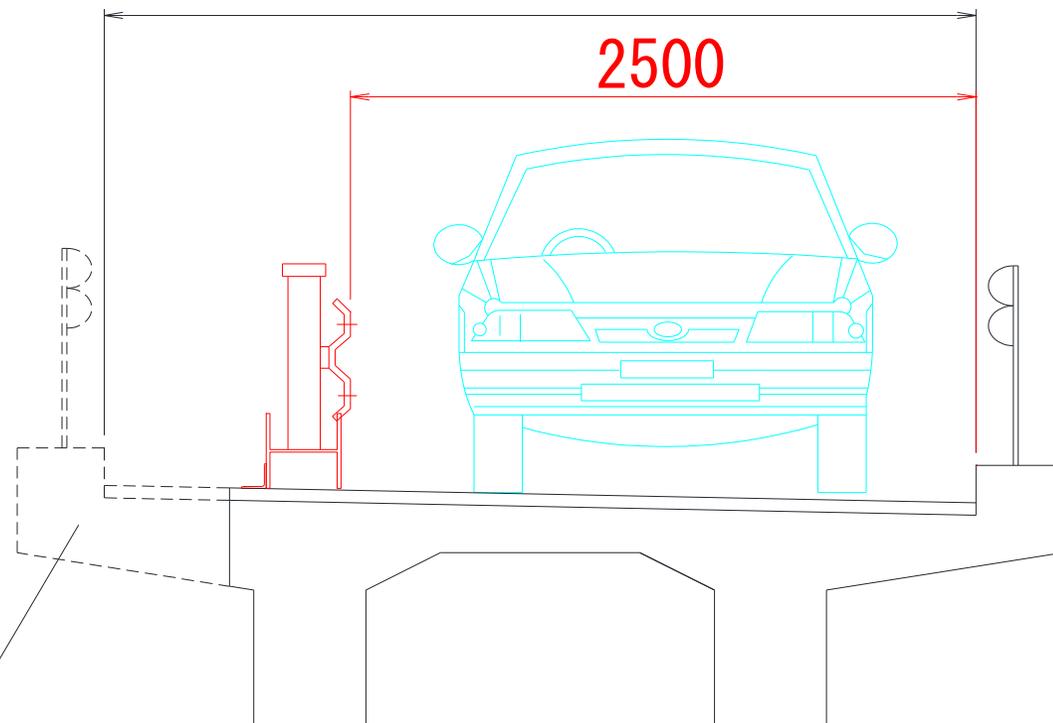

5. その他工事の詳細について（工事中のお願い）

③通行止めについて

パターン2


期間：現在～令和9年1月頃 数日程度

時間帯：夜間22:00～5:00予定

※橋の撤去した部材等が、
橋の上空を通過するため
通行止めとなります。

凡例  迂回ルート


 迂回ルート

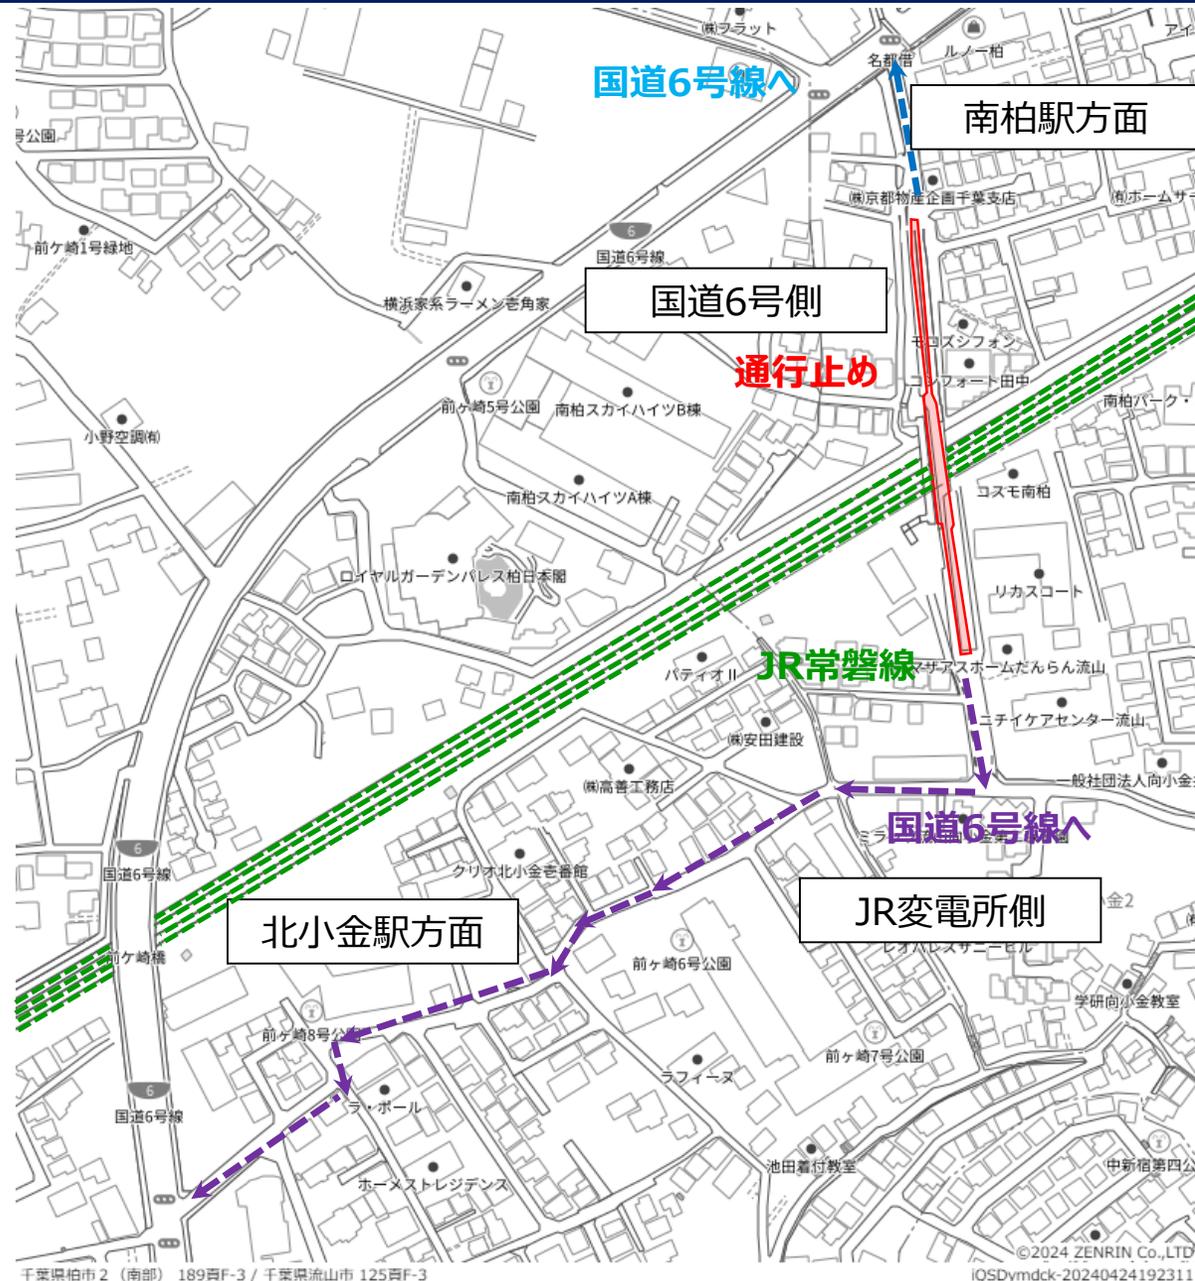

5. その他工事の詳細について（工事中のお願い）


③通行止めについて パターン3

期間：令和6年6月頃から令和8年12月頃
時間帯：終日予定

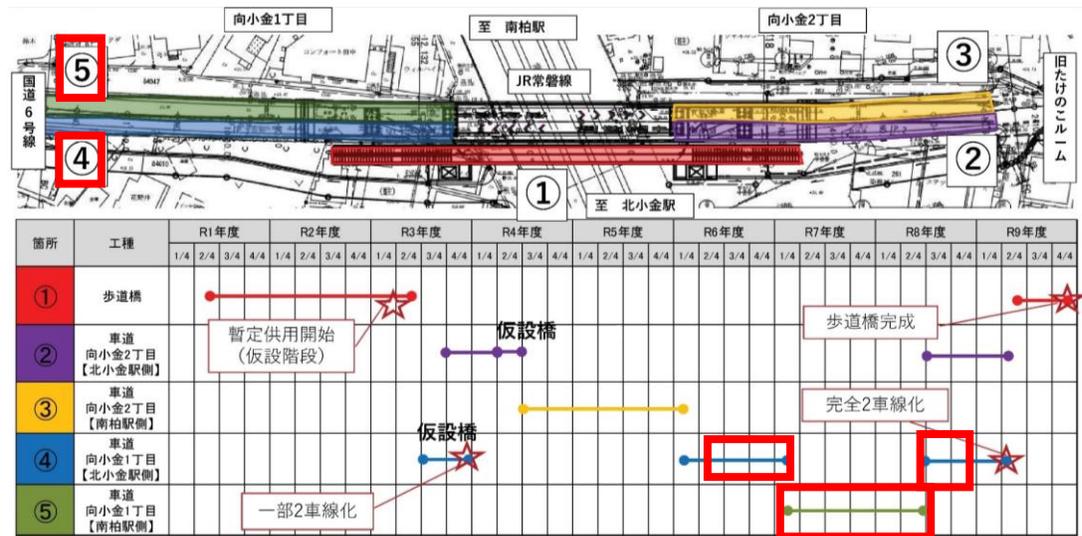

※橋の撤去および建設時に、橋を支える部材を橋の下に設置するため通行止めとなります。

凡例 迂回ルート
 迂回ルート

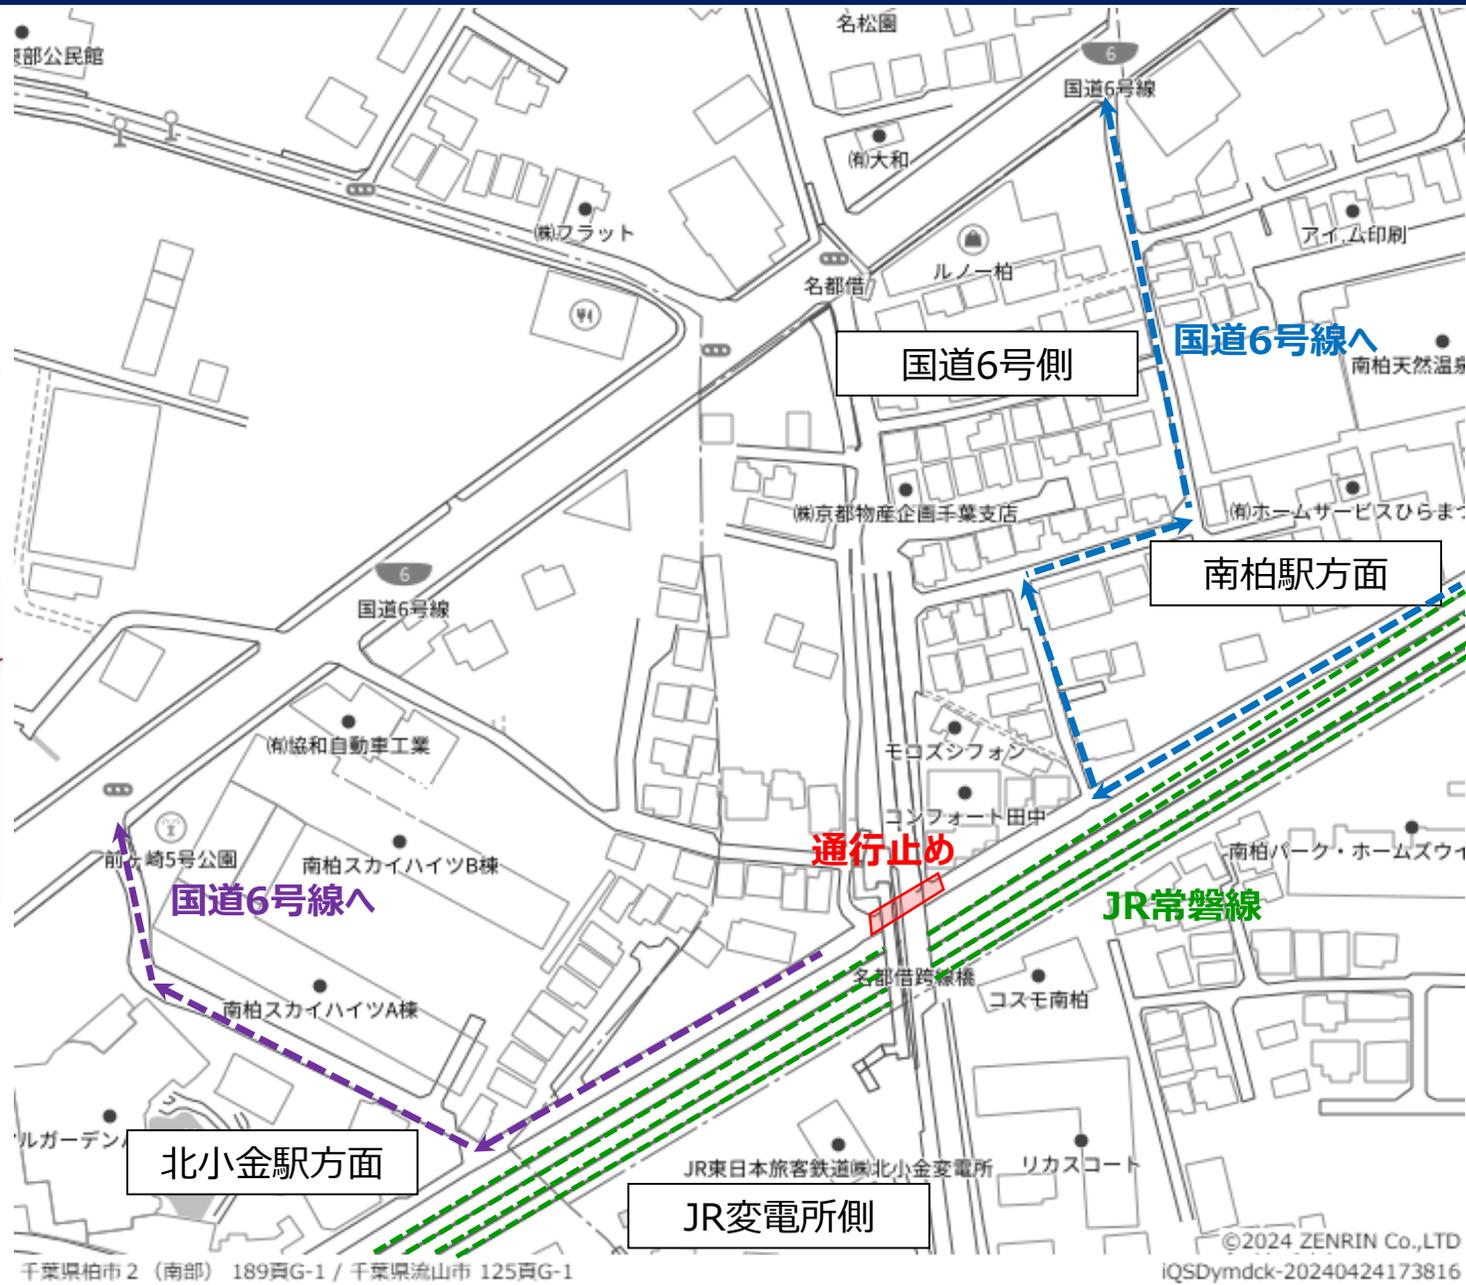


5. その他工事の詳細について（工事中のお願い）

③通行止めについて パターン4


期間：令和7年7月頃から令和9年3月頃

時間帯：終日予定

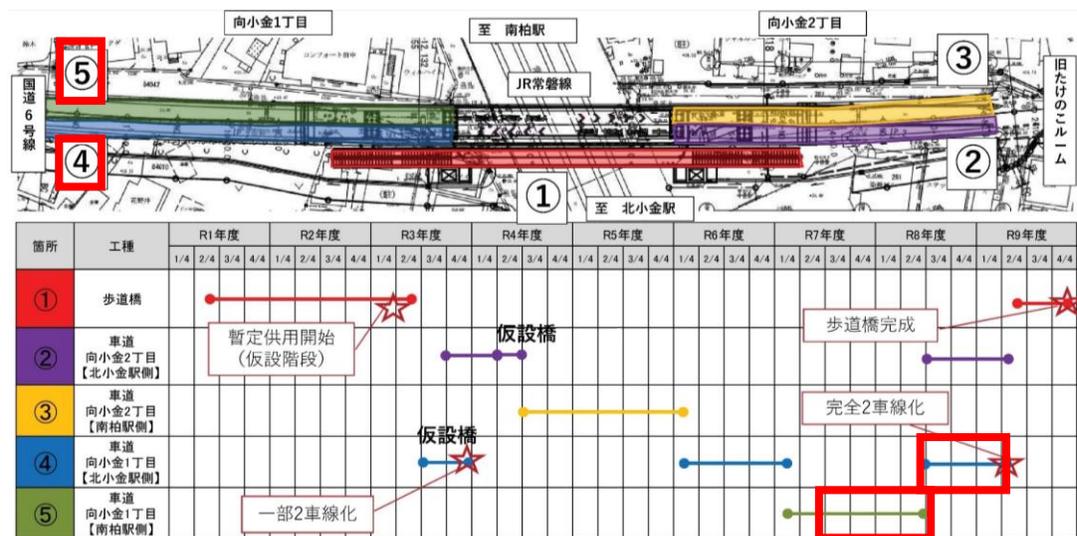

※施工時に大きな重機を使用するため、
通行止めとなります。

凡例 迂回ルート
 迂回ルート

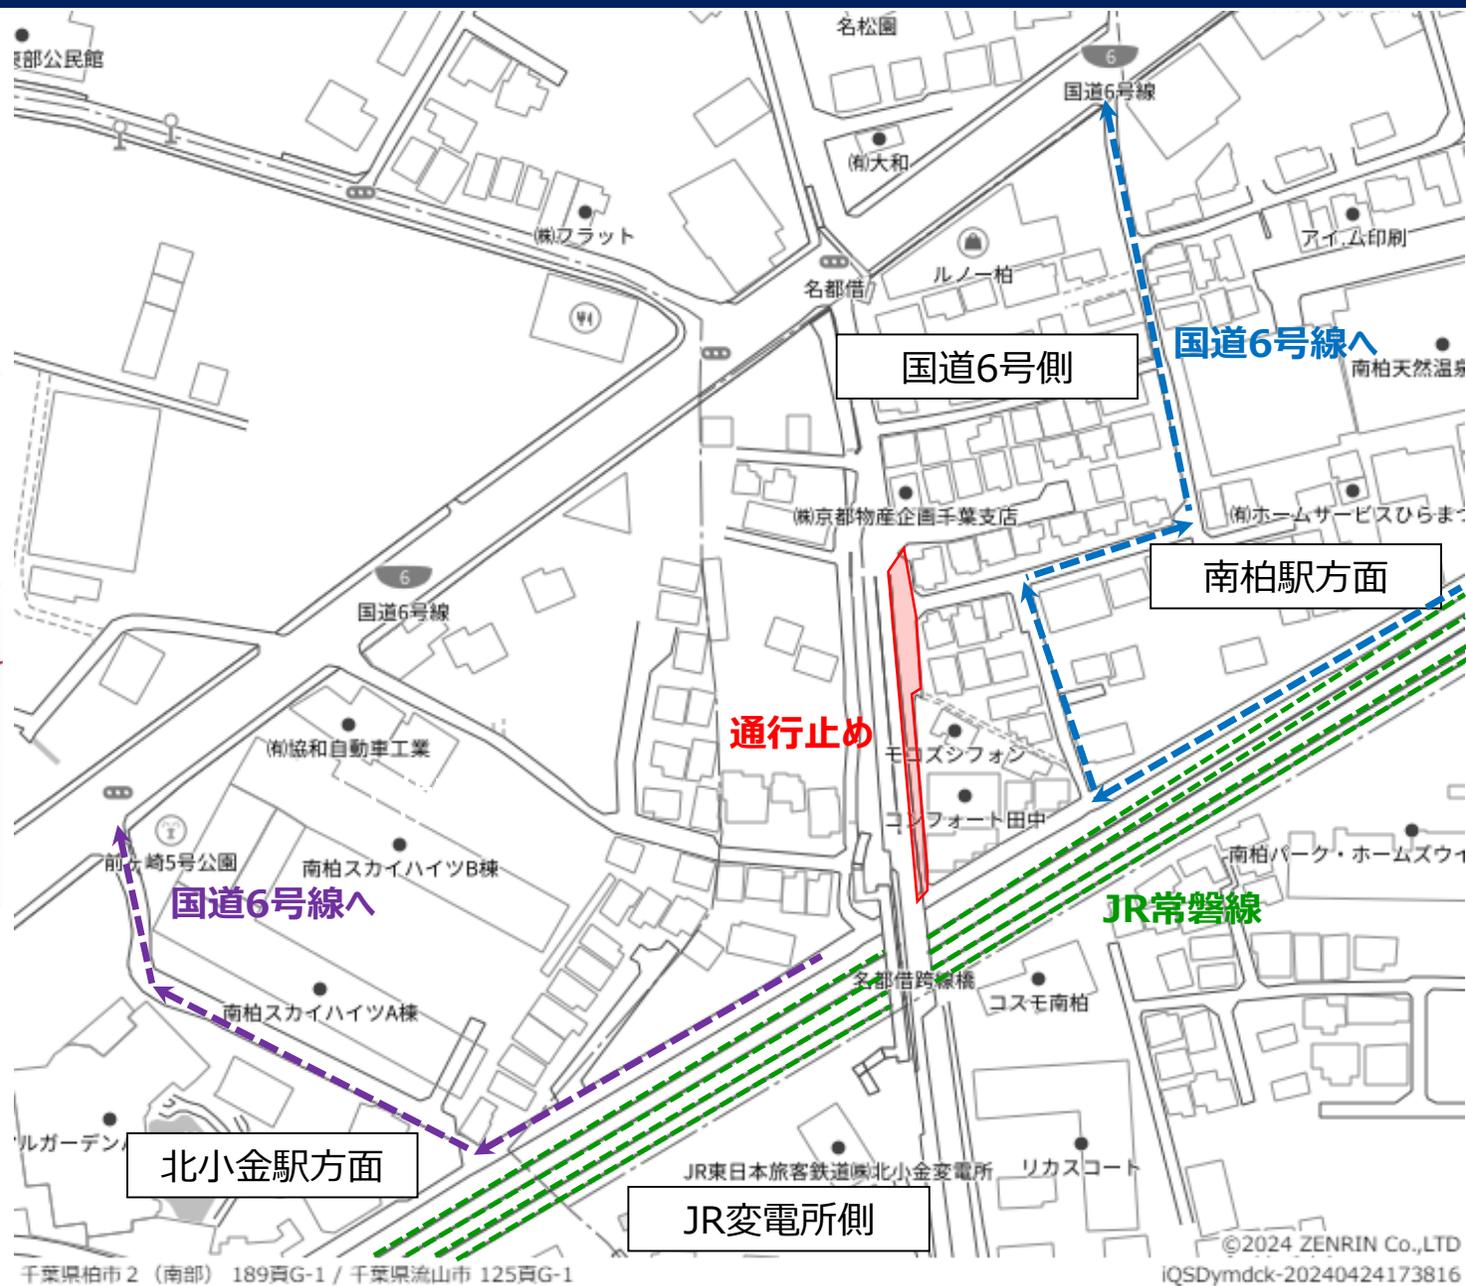

5. その他工事の詳細について（施工体制）

現場事務所案内図



ユニオン建設株式会社


現場代理人
橋本 英和

監理技術者
佐野 琢也

工事管理者
宇部 寿



拡大図

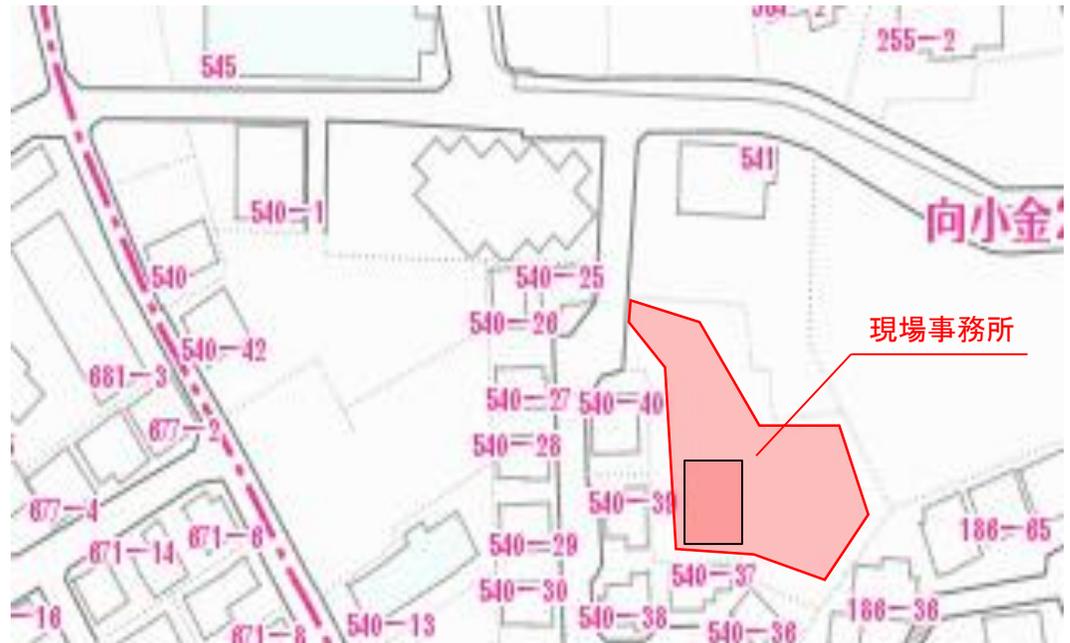

6. 側道整備について

側道位置




現況写真



6. 側道整備について

将来幅員

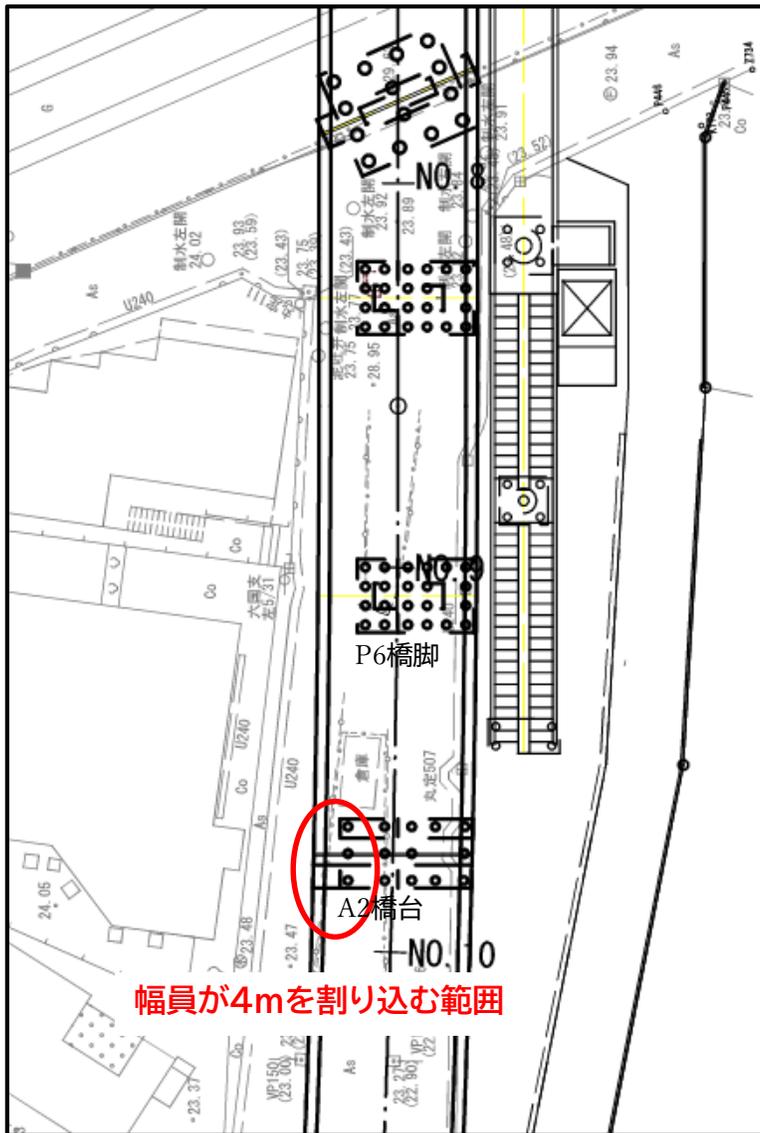

橋台イメージ



6. 側道整備について

側道整備




将来幅員



6. 側道整備について

↑ 至 南柏駅

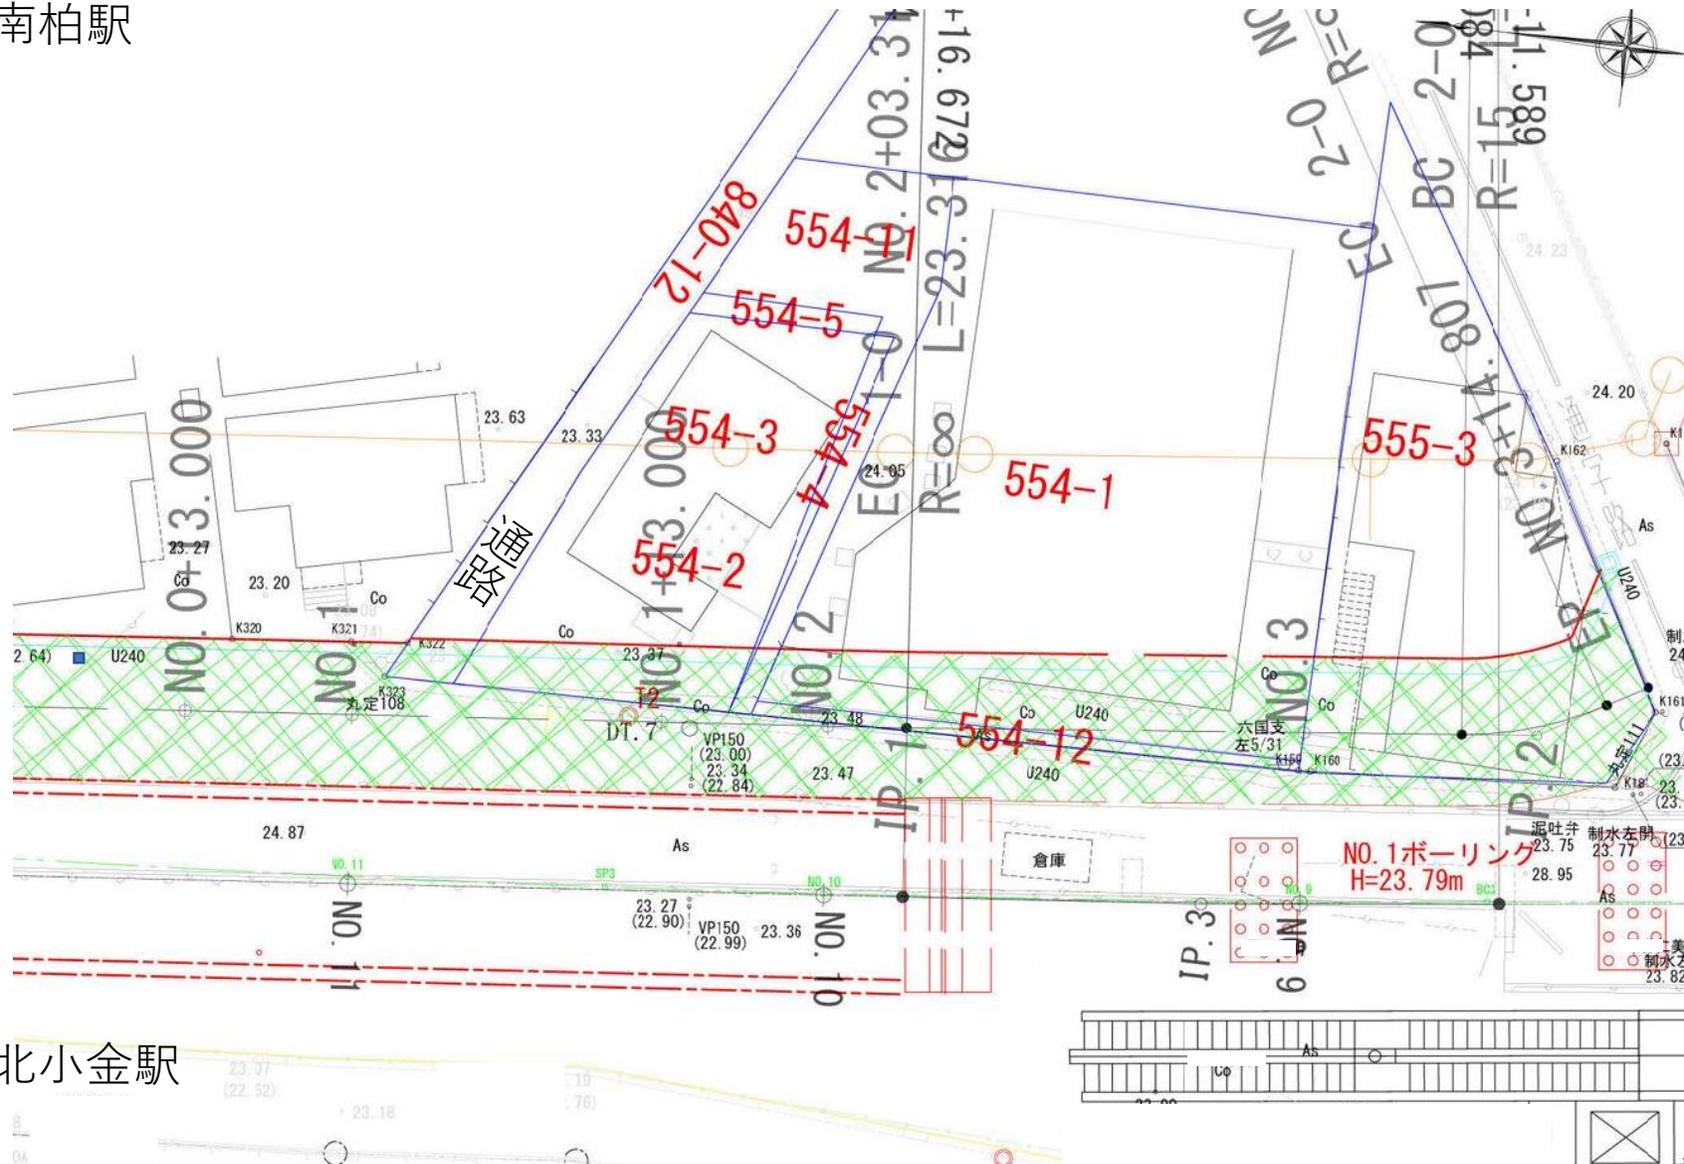

↓ 至 北小金駅
