


# (仮称)三郷流山橋だより

## 4. 2車線先行整備時と4車線整備時の道路線形

- ・(仮称)三郷流山橋は片側2車線の全4車線道路として計画されていますが、今回は有料道路事業により2車線を先行整備します。
- ・2車線先行整備時と4車線整備時の主な相違点は 松戸野田線との交差点、南北地域の横断道路位置、転回路の位置、3号交差点への接続方法です。

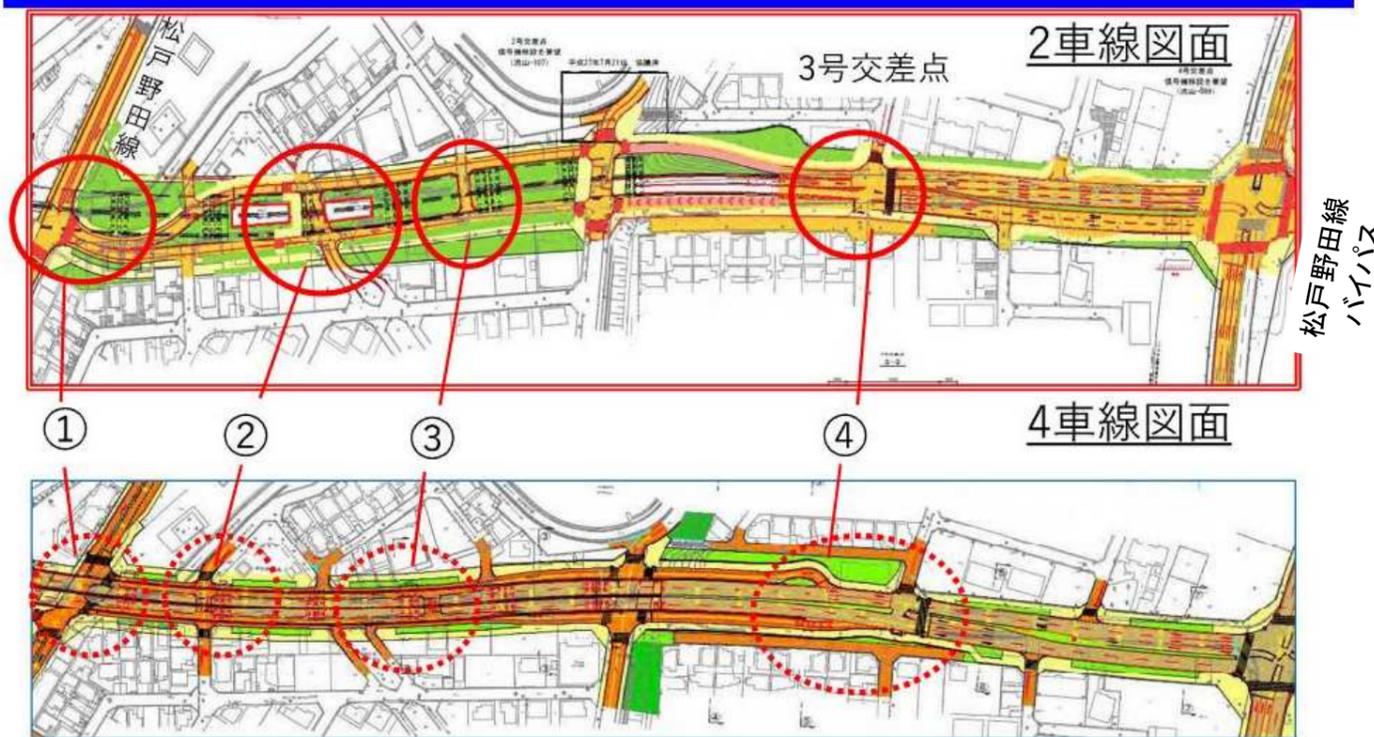

至 江戸川

至 流山警察

## 5. 都市軸道路他区間の整備状況

- ・区画整理事業が施行中の新市街地地区において、流山教習所跡地区間が平成31年3月に開通し、国道16号方面からの利便性向上が図られました。
- ・県柏土木事務所が所管する741m区間は、平成31年3月末時点で98%の用地を取得しています。引き続き、残りの用地取得と道路築造工事を行います。

### 問合せ

千葉県東葛飾土木事務所建設課・用地課  
 電話047-364-5143・047-364-5895  
 流山市土木部道路建設課  
 電話04-7150-6094

「(仮称)三郷流山橋だより」は、流山市のホームページでもご覧になれます。  
<http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002088/1002134/1002143.html>

第7号 令和2年3月発行  
 千葉県東葛飾土木事務所  
 流山市土木部

皆様のご協力により、用地取得については平成31年3月末で完了しました。

また、令和元年5月から道路切替工事等に着手し、現在は、橋脚工事及び和田堀水路の切回し工事を行っています。近隣の皆様にはご不便をおかけしますが、安全第一で進めてまいります。令和4年度末の完成を目指し、千葉県と流山市が協力して事業推進に努めてまいります。引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いします。



## 1. 地元協議会等の状況

### (1) 地元協議会

- ・第13回会合：平成30年11月13日  
 計画道路線形、今後の工事発注計画について県より報告


### (2) 事業説明会

- ・平成30年6月3日  
 事業概要、事業手法(有料道路事業)、沿道環境予測について説明
- ・令和元年10月5日  
 現道の切替え、今年度及び今後の工事スケジュール、2車線整備時の道路線形について説明


説明資料は、千葉県東葛飾土木事務所のホームページでもご覧になれます。  
<https://www.pref.chiba.lg.jp/cs-toukatsu/jigyouseitumei.html>

## 2. 現道の切替について

- ・（仮称）三郷流山橋の下部工（橋脚、橋台）を施工するために、令和元年11月27日に道路の切替を行いました。
- ・三輪野山3丁目側の歩道が使用できなくなりましたので、仮設階段をお使い頂きますようお願いいたします。

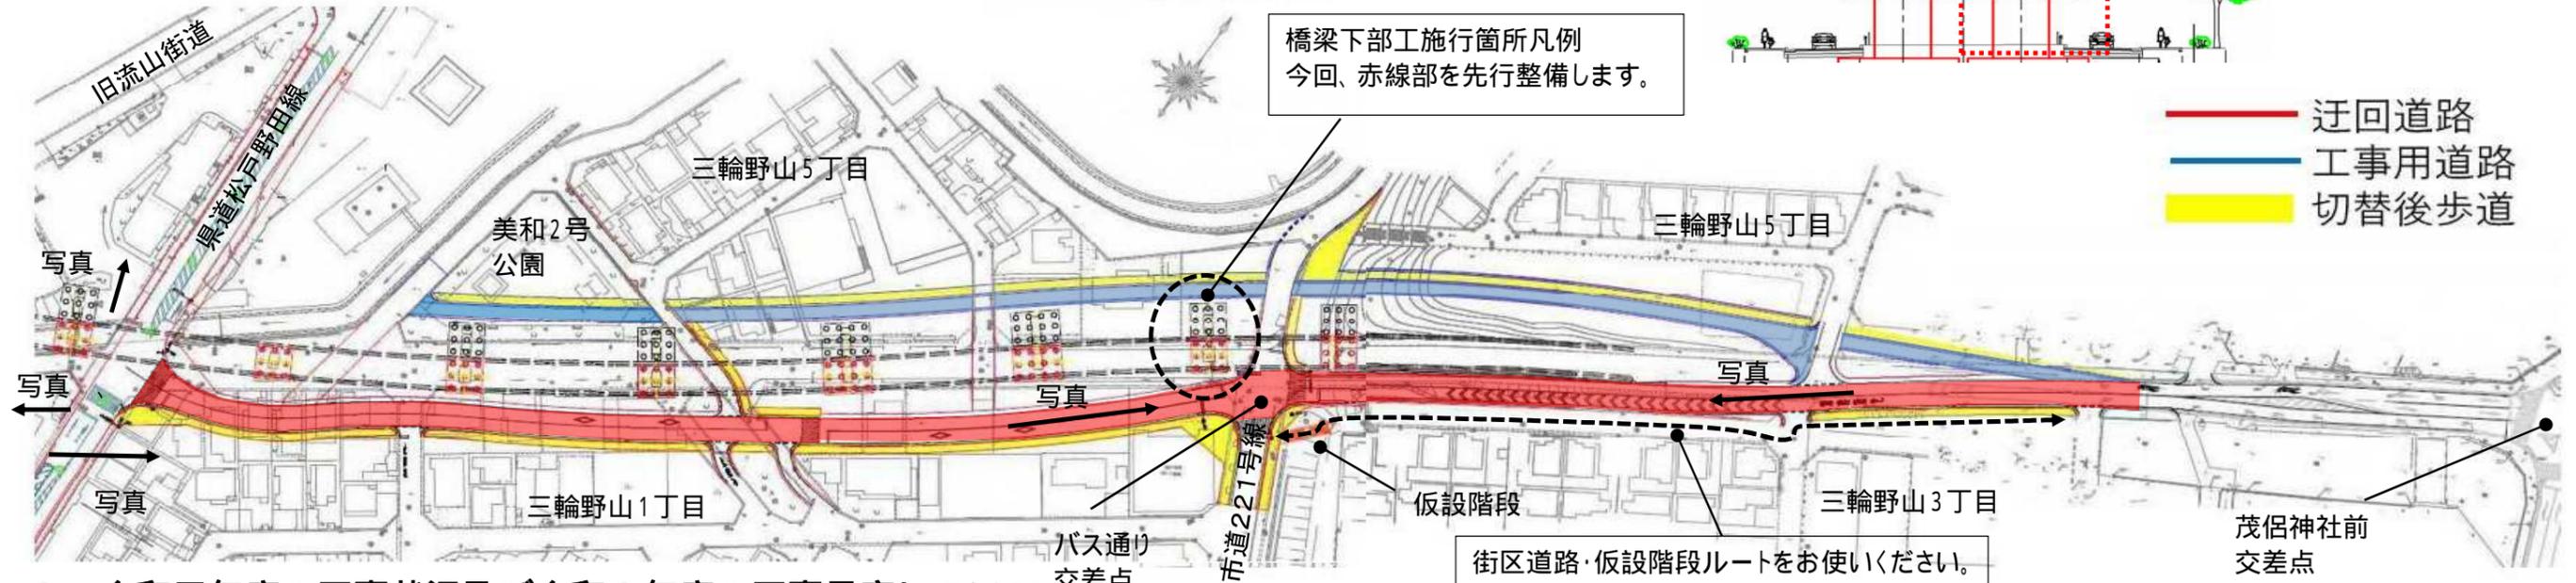

【橋脚施工イメージ】

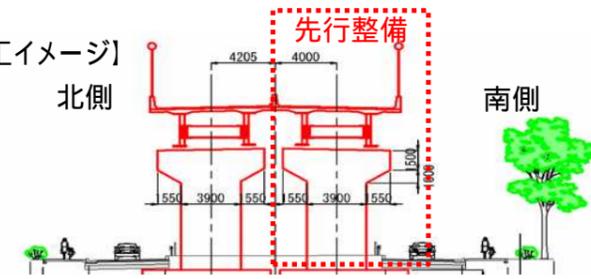

- 迂回道路
- 工事用道路
- 切替後歩道

## 3. 令和元年度の工事状況及び令和2年度の工事予定について



【写真】

- ・江戸川河川区域における橋脚工事の状況（埼玉県道路公社施工分）
- ・令和2年度は、千葉県施工分の橋脚工事も行います。



【写真】

- ・橋脚工事を行うため、道路の切替を行いました。
- ・引き続き、仮設柵内で橋脚工事を行います。
- ・令和2年度は、橋桁の製作を行うとともに、橋脚工事完了後の橋桁工事の準備を進めます。



【写真】

- ・南側の歩道を廃止し、仮設階段ルートへ歩行者動線が変更となりました。
- ・今後も、工事の進捗に合わせた道路の切替を計画していますのでご協力をお願いします。



【写真】

- ・今上落しとの接続部において、和田堀樋管の改修工事を行いました。
- ・引き続き、仮設柵内で橋脚工事を行います。
- ・令和2年度は橋桁の製作等、橋桁工事の準備を進めます。



【写真】

- ・和田堀水路の切回し工事状況
- ・水路切回し工事完了後、橋脚工事を行います。
- ・令和2年度は、旧流山街道の道路切替を計画しています。



【写真】

- ・橋脚工事を行うため、道路の切替を行いました。
- ・交差点の横断歩行者等、安全に配慮しながら進めていきます。
