

安全で使いやすい橋になおしています。



令和4年3月撮影

名都借跨線橋完成イメージ

# 名都借跨線橋だより VOL.1

お問い合わせ

流山市役所土木部道路建設課

04-7150-6094

✉dourokensetsu@city.nagareyama.chiba.jp

令和4年5月発行



流山市ホームページ  
(=二次元コード)に  
て本紙PDFファイル  
を公開しております。

# 令和9年度に完成を予定している名都借跨線橋道路拡幅改良事業の最新情報をお知らせします。

## 4月現在の状況

向小金1丁目側



- ・令和4年1月、仮設橋工事が完了し、車道が片側交互通行から暫定であります。相互通行となりました。
- ・工事は、予定通り進んでいます。

向小金2丁目側



- ・令和4年1月から橋の一部撤去を始めました。
- ・工事は、予定通り進んでいます。
- ・新たな車道を作る作業の関係上、現在の車道幅を一部狭くしています。自転車は、なるべく新設歩道橋をご利用ください。

新設歩道橋




- ・令和3年7月から、新しい歩道橋の利用を開始しました。
- ・階段とスロープは、車道工事の障害になるため、仮のものです。全ての車道工事が終わったあと、車道沿いに、勾配を緩やかにして、新しく作りなおします。
- ・エレベーターについては令和9年度に設置を予定しています。

騒音・振動の状況



- ・1丁目側と2丁目側に設置している騒音・振動の計測状況は、昼間、夜間共に環境基準値内となっていることを確認しています。
- 環境基準値  
 騒音：85 dB を超えないこと  
 振動：75 dB を超えないこと

## 令和4年度の工事予定

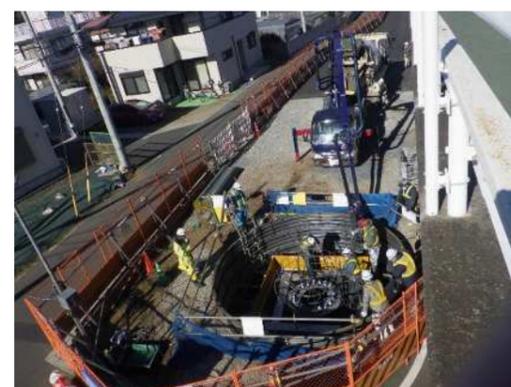

- ・上半期(4月から10月頃)は、引き続き、向小金2丁目側の北小金方で、新設する橋を支える、複数の基礎と脚の工事を行います。
- ・また、脚の上を渡す、桁の工事を進めていきます。



- ・下半期(10月頃から令和5年3月頃)は、向小金2丁目側の南柏方の工事の準備に入ります。
- ・このため、12月頃から、南柏駅方の側道通行止めを予定しています。
- ・通行止め区間の沿線の皆様には、別途、2週間くらい前までに、代替駐車場等のご案内をいたします。

## 皆様からの電話お問い合わせが多かった内容の回答

質問 歩道橋の階段が、急なのですが、このままですか。

回答 車道橋の工事が終わった後(令和9年度予定)緩やかな階段につくりなおします。

質問 エレベーターは、いつ頃設置予定ですか。

回答 車道橋の工事が終わった後(令和9年度予定)設置します。

質問 向小金2丁目側の車道の斜路が狭められています。どうしても、自転車で車道を通らなければならない場合、走行が危険です。

回答 隣に新たに車道を作る工事作業の関係上、令和5年3月頃まで、車道を狭める必要があります。新設歩道橋の仮スロープの利用が難しい、高齢の方や、電動アシスト付自転車の方々にはご迷惑をおかけしますが、御理解をお願いします。

長期にわたる工事期間中、皆様にご迷惑をおかけいたします。安全に配慮して進めてまいりますのでご理解とご協力をお願いします。

(次回令和4年10月頃発行予定)
