


令和8年度上半期工事予定箇所図(北千葉広域水道企業団)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入 例：(流山市役所道路管理課)

| 凡例          |      |
|-------------|------|
| <div></div> | 工事箇所 |

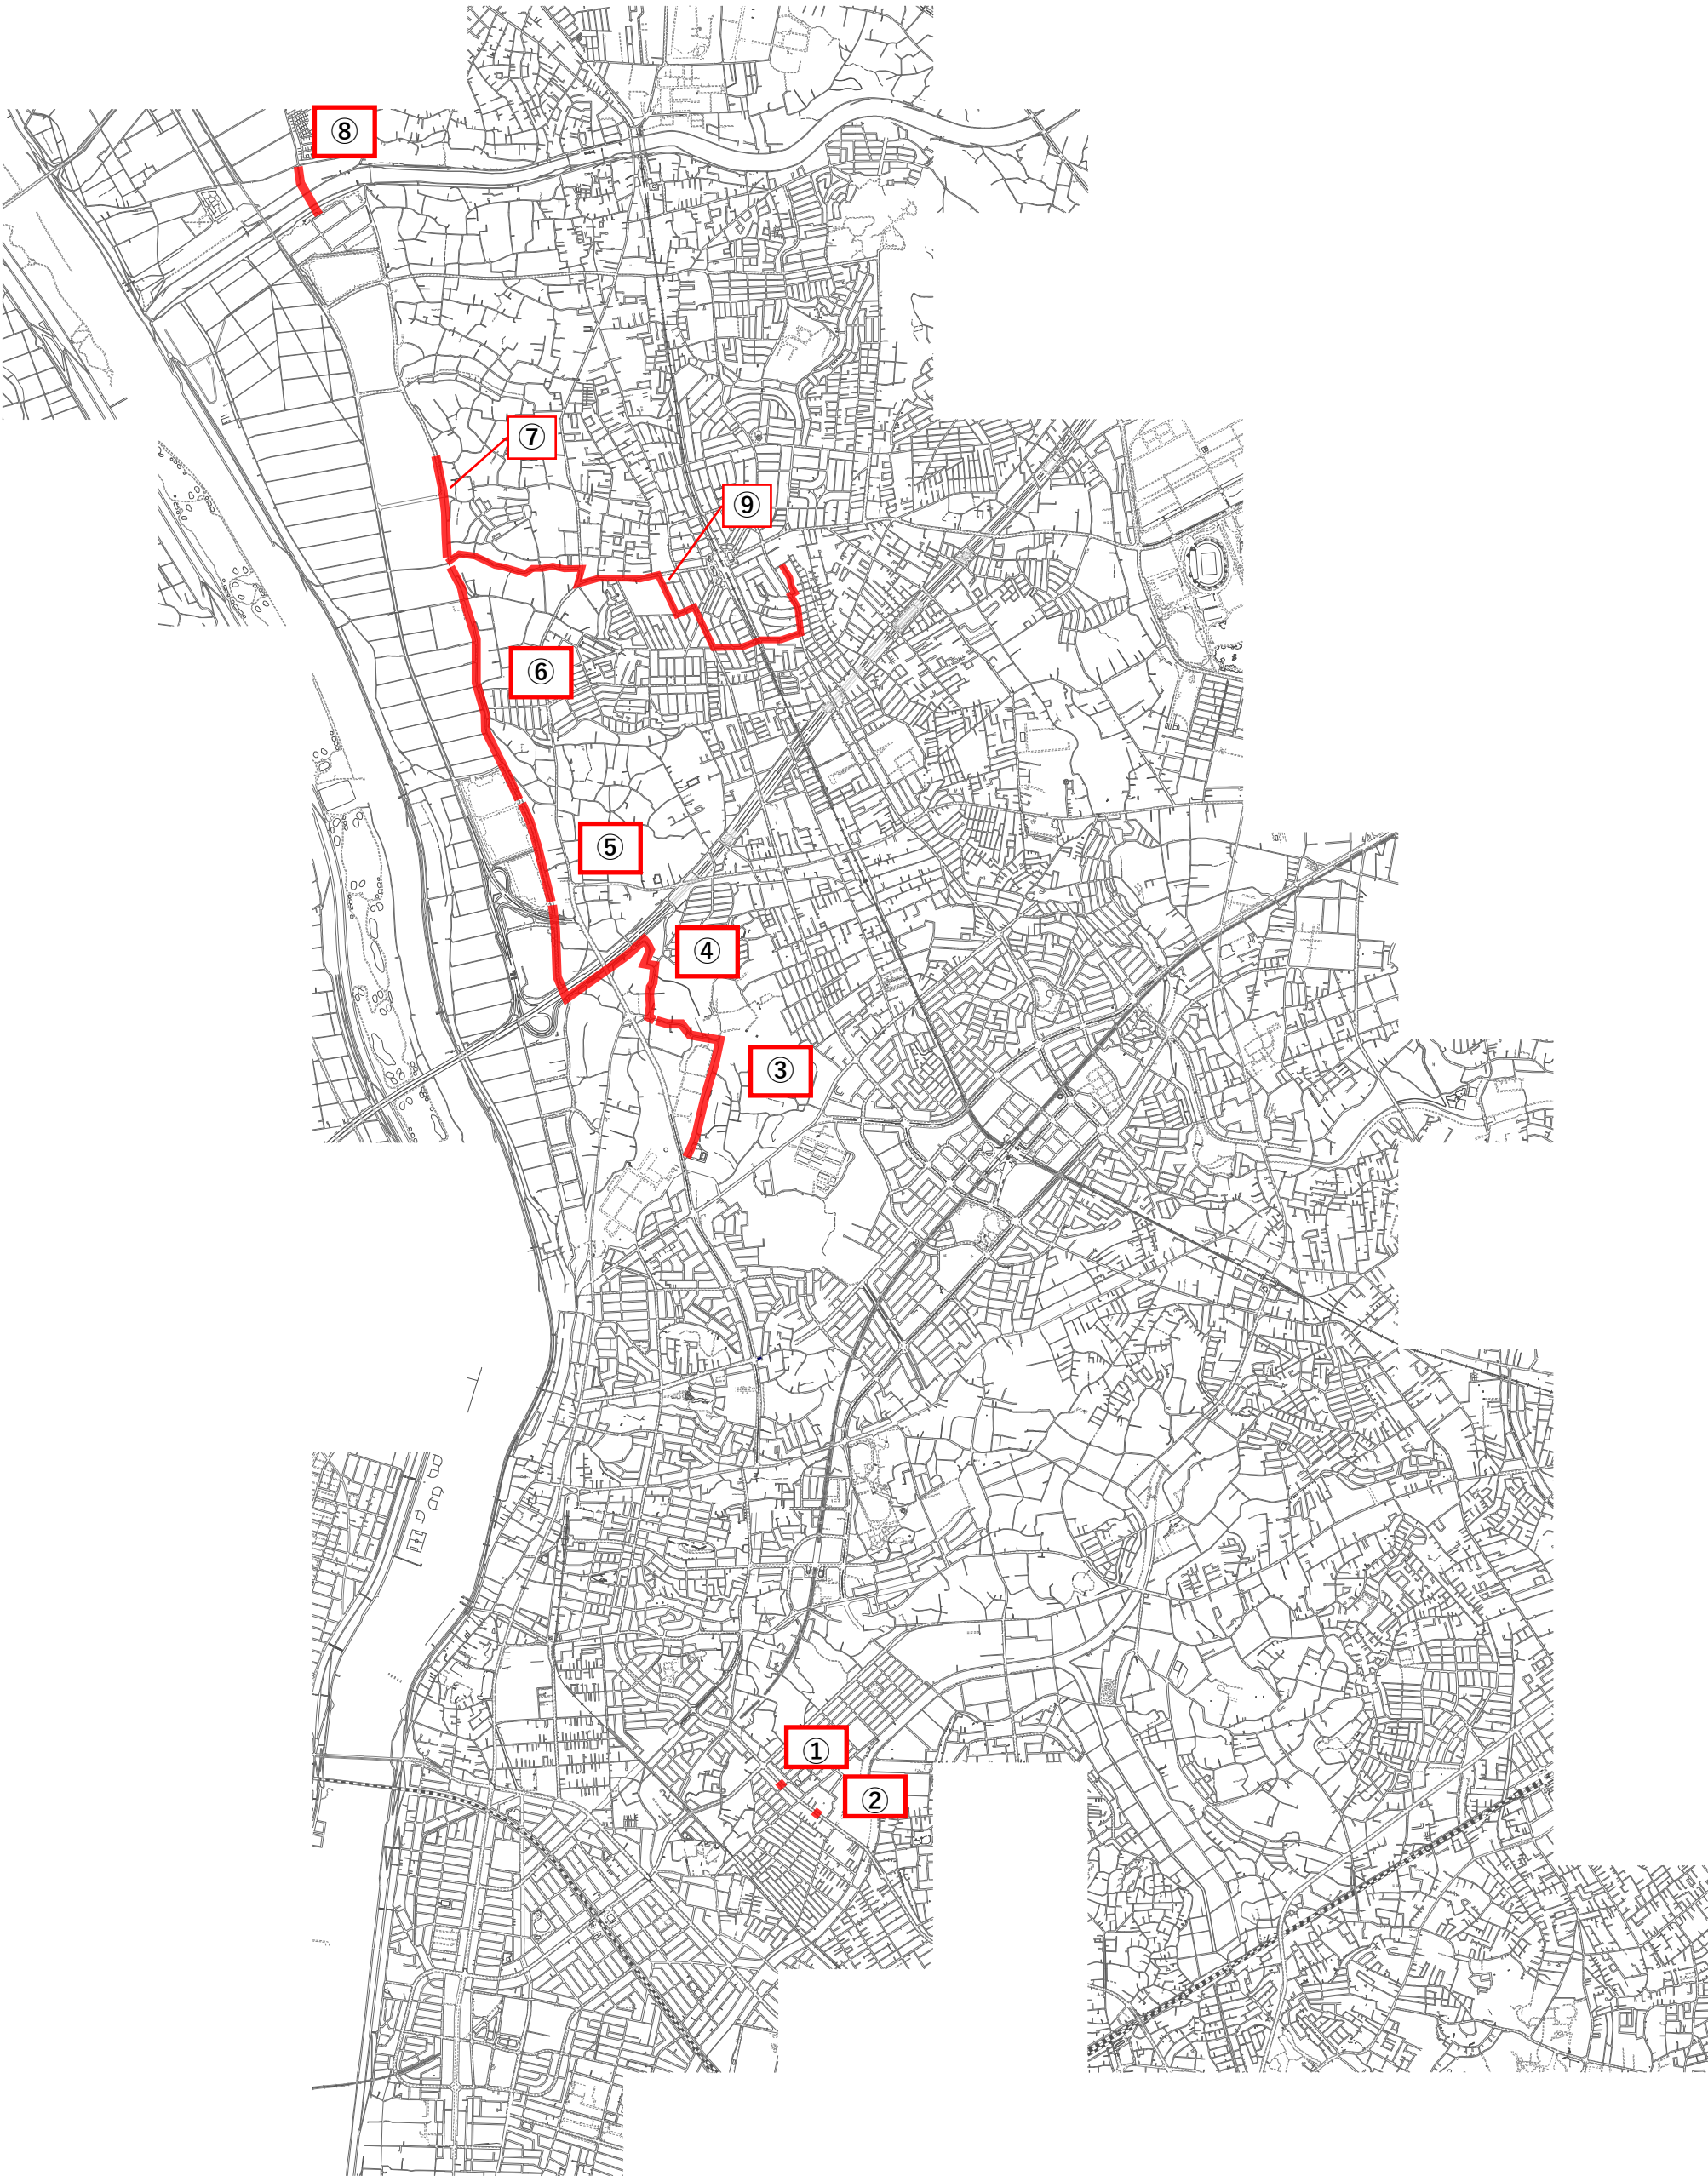

(様式1)

## 令和8年度上半期道路占用工事計画書 (R8年4月～R8年9月)

事業者名：北千葉広域水道企業団

| 図面番号 | 路線名<br>(市道 号線)                    | 工事区間<br>(字名、丁名まで)                 | 工事期間<br>(年 月～年 月)   | 占用物件の構造及び施工延長                                                                                 | 車道・歩道<br>の別 | 縦横断の<br>別 | 備考                          |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| ①    | 市道107号線                           | 宮園2-2-3地先                         | 令和8年7月～<br>令和8年11月  | 外部電源装置 1基<br>高珪素鋳鉄電極 5本                                                                       | 車道・歩道       | 縦断        | 送水管柏線55工区<br>電気防食施設<br>設置工事 |
| ②    | 市道107号線                           | 鱈ヶ崎1677地先                         | 令和8年7月～<br>令和8年11月  | ターミナル設置工 一式                                                                                   | 車道          | 縦断        | 送水管柏線55工区<br>電気防食施設<br>設置工事 |
| ③    | 市道218号線<br>市道21020号線<br>市道21039号線 | 桐ヶ谷字和田130<br>番地～上貝塚<br>112-7番地先   | 令和7年10月～<br>令和9年3月  | 送水管布設工<br>開削: NS形φ800、L=230m<br>推進: PN形φ800m(鞆管φ1000)、L=440m                                  | 車道          | 縦断        | 第二送水管布設工<br>事(関宿線1工区)       |
| ④    | 市道289、19017、<br>19025、21012号線     | 上貝塚114-1番地先<br>～南481-1番地先         | 令和8年9月～<br>令和11年3月  | 送水管布設工<br>開削: NS形φ800、L=830m<br>推進: PN形φ800m(鞆管φ1000)、L=520m                                  | 車道・歩道       | 縦断        | 第二送水管布設工<br>事(関宿線2工区)       |
| ⑤    | 市道19017号線<br>市道19004号線            | 流山市南481-1番<br>地先～流山市南<br>261-1番地先 | 令和8年6月～<br>令和9年11月  | 送水管布設工<br>開削: NS形φ800、L=445m                                                                  | 車道          | 縦断        | 第二送水管(関宿線<br>3工区)布設工事       |
| ⑥    | 市道213号線<br>市道19004号線              | 南261-1番地先～<br>中野久木287-1番<br>地先    | 令和8年9月～<br>令和10年12月 | 送水管布設工<br>開削: NS形φ800、L=20m    NS形φ700、L=6m<br>GΧ形φ350、L=12m<br>推進: PN形φ800m(鞆管φ1000)、L=1228m | 車道・歩道       | 縦断        | 第二送水管布設工<br>事(関宿線4工区)       |
| ⑦    | 市道213号線                           | 大字中野久木地<br>先<br>～大字平方地先           | 令和8年2月～<br>令和9年8月   | 送水管布設工<br>開削: NS形φ700、L=512m                                                                  | 車道          | 縦断        | 第二送水管布設工<br>事(関宿線5工区)       |
| ⑧    | 市道02092号線                         | 大字西深井<br>(利根運河横断)                 | 令和7年8月～<br>令和8年11月  | 送水管布設工<br>開削: NS形φ700、L=56m<br>推進: PN形φ700m(鞆管φ900)、L=188m                                    | 車道          | 縦断        | 第二送水管布設工<br>事(関宿線7工区)       |
| ⑨    | 市道207号線 外                         | 大字中野久木地先<br>～江戸川台浄水場              | 令和8年6月～<br>令和11年1月  | 送水管布設工<br>開削: GΧ形φ350、L=1872m<br>推進: PN形、GΧ形φ350m(鞆管φ500、φ800)、ΣL=734m                        | 車道          | 縦断        | 第二送水管(江戸川台<br>支線1工区)布設工事    |
