（様式1）　　令和7年度上半期道路占用工事計画書 （R7年4月～R7年9月）

事業者名：北千葉広域水道企業団

図面番号	路線名 （市道　　号線）	工事区間 （字名、丁名まで）	工事期間 （年　月～年　月）	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩道の別	縦横断の別	備考
①	市道107号線	宮園2-2-3地先	令和7年7月～ 令和7年11月	外部電源装置　　1基 高珪素鋳鉄電極　5本	車道・歩道	縦断	送水管柏線55工区 電気防食施設 設置工事
②	市道107号線	鰭ヶ崎1677地先	令和7年7月～ 令和7年11月	ターミナル設置工　一式	車道	縦断	送水管柏線55工区 電気防食施設 設置工事

（様式2）　　令和7年度下半期以降の道路占用工事計画書 （R7年10月以降）

事業者名：北千葉広域水道企業団

図面番号	路線名 （市道　　号線）	工事区間 （字名、丁名まで）	工事期間 （年　月～年　月）	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩道の別	縦横断の別	備考
①	市道107号線	宮園2-2-3地先	令和7年7月～ 令和7年11月	外部電源装置　1基 高珪素鋳鉄電極　5本	車道・歩道	縦断	送水管柏線55工区 電気防食施設 設置工事
②	市道107号線	鰭ヶ崎1677地先	令和7年7月～ 令和7年11月	ターミナル設置工　一式	車道	縦断	送水管柏線55工区 電気防食施設 設置工事
③	市道218号線 市道21020号線	桐ヶ谷字和田地先 ～大字上貝塚地先	令和7年10月～ 令和9年3月	送水管布設工 開削：NS形φ800、L=229m 推進：PN形φ800m（鞘管φ1000）、 L=480m	車道	縦断	第二送水管布設工事（関宿線1工区）
④	市道19017号線 市道19004号線	大字南地先	令和7年10月～ 令和8年11月	送水管布設工 開削：NS形φ800、L=500m	車道	縦断	第二送水管布設工事（関宿線3工区）
⑤	市道213号線	大字中野久木地先 ～大字平方地先	令和7年10月～ 令和9年1月	送水管布設工 開削：NS形φ700、L=530m	車道	縦断	第二送水管布設工事（関宿線5工区）
⑥	市道02092号線	大字西深井 （利根運河横断）	令和7年10月～ 令和8年11月	送水管布設工 開削：NS形φ700、L=56m 推進：PN形φ700m（鞘管φ900）、 L=188m	車道	縦断	第二送水管布設工事（関宿線7工区）

（様式３）

令和7年度上半期工事予定箇所図(北千葉広域水道企業団)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入　　例：(流山市役所道路管理課)

凡例	
━	工事箇所

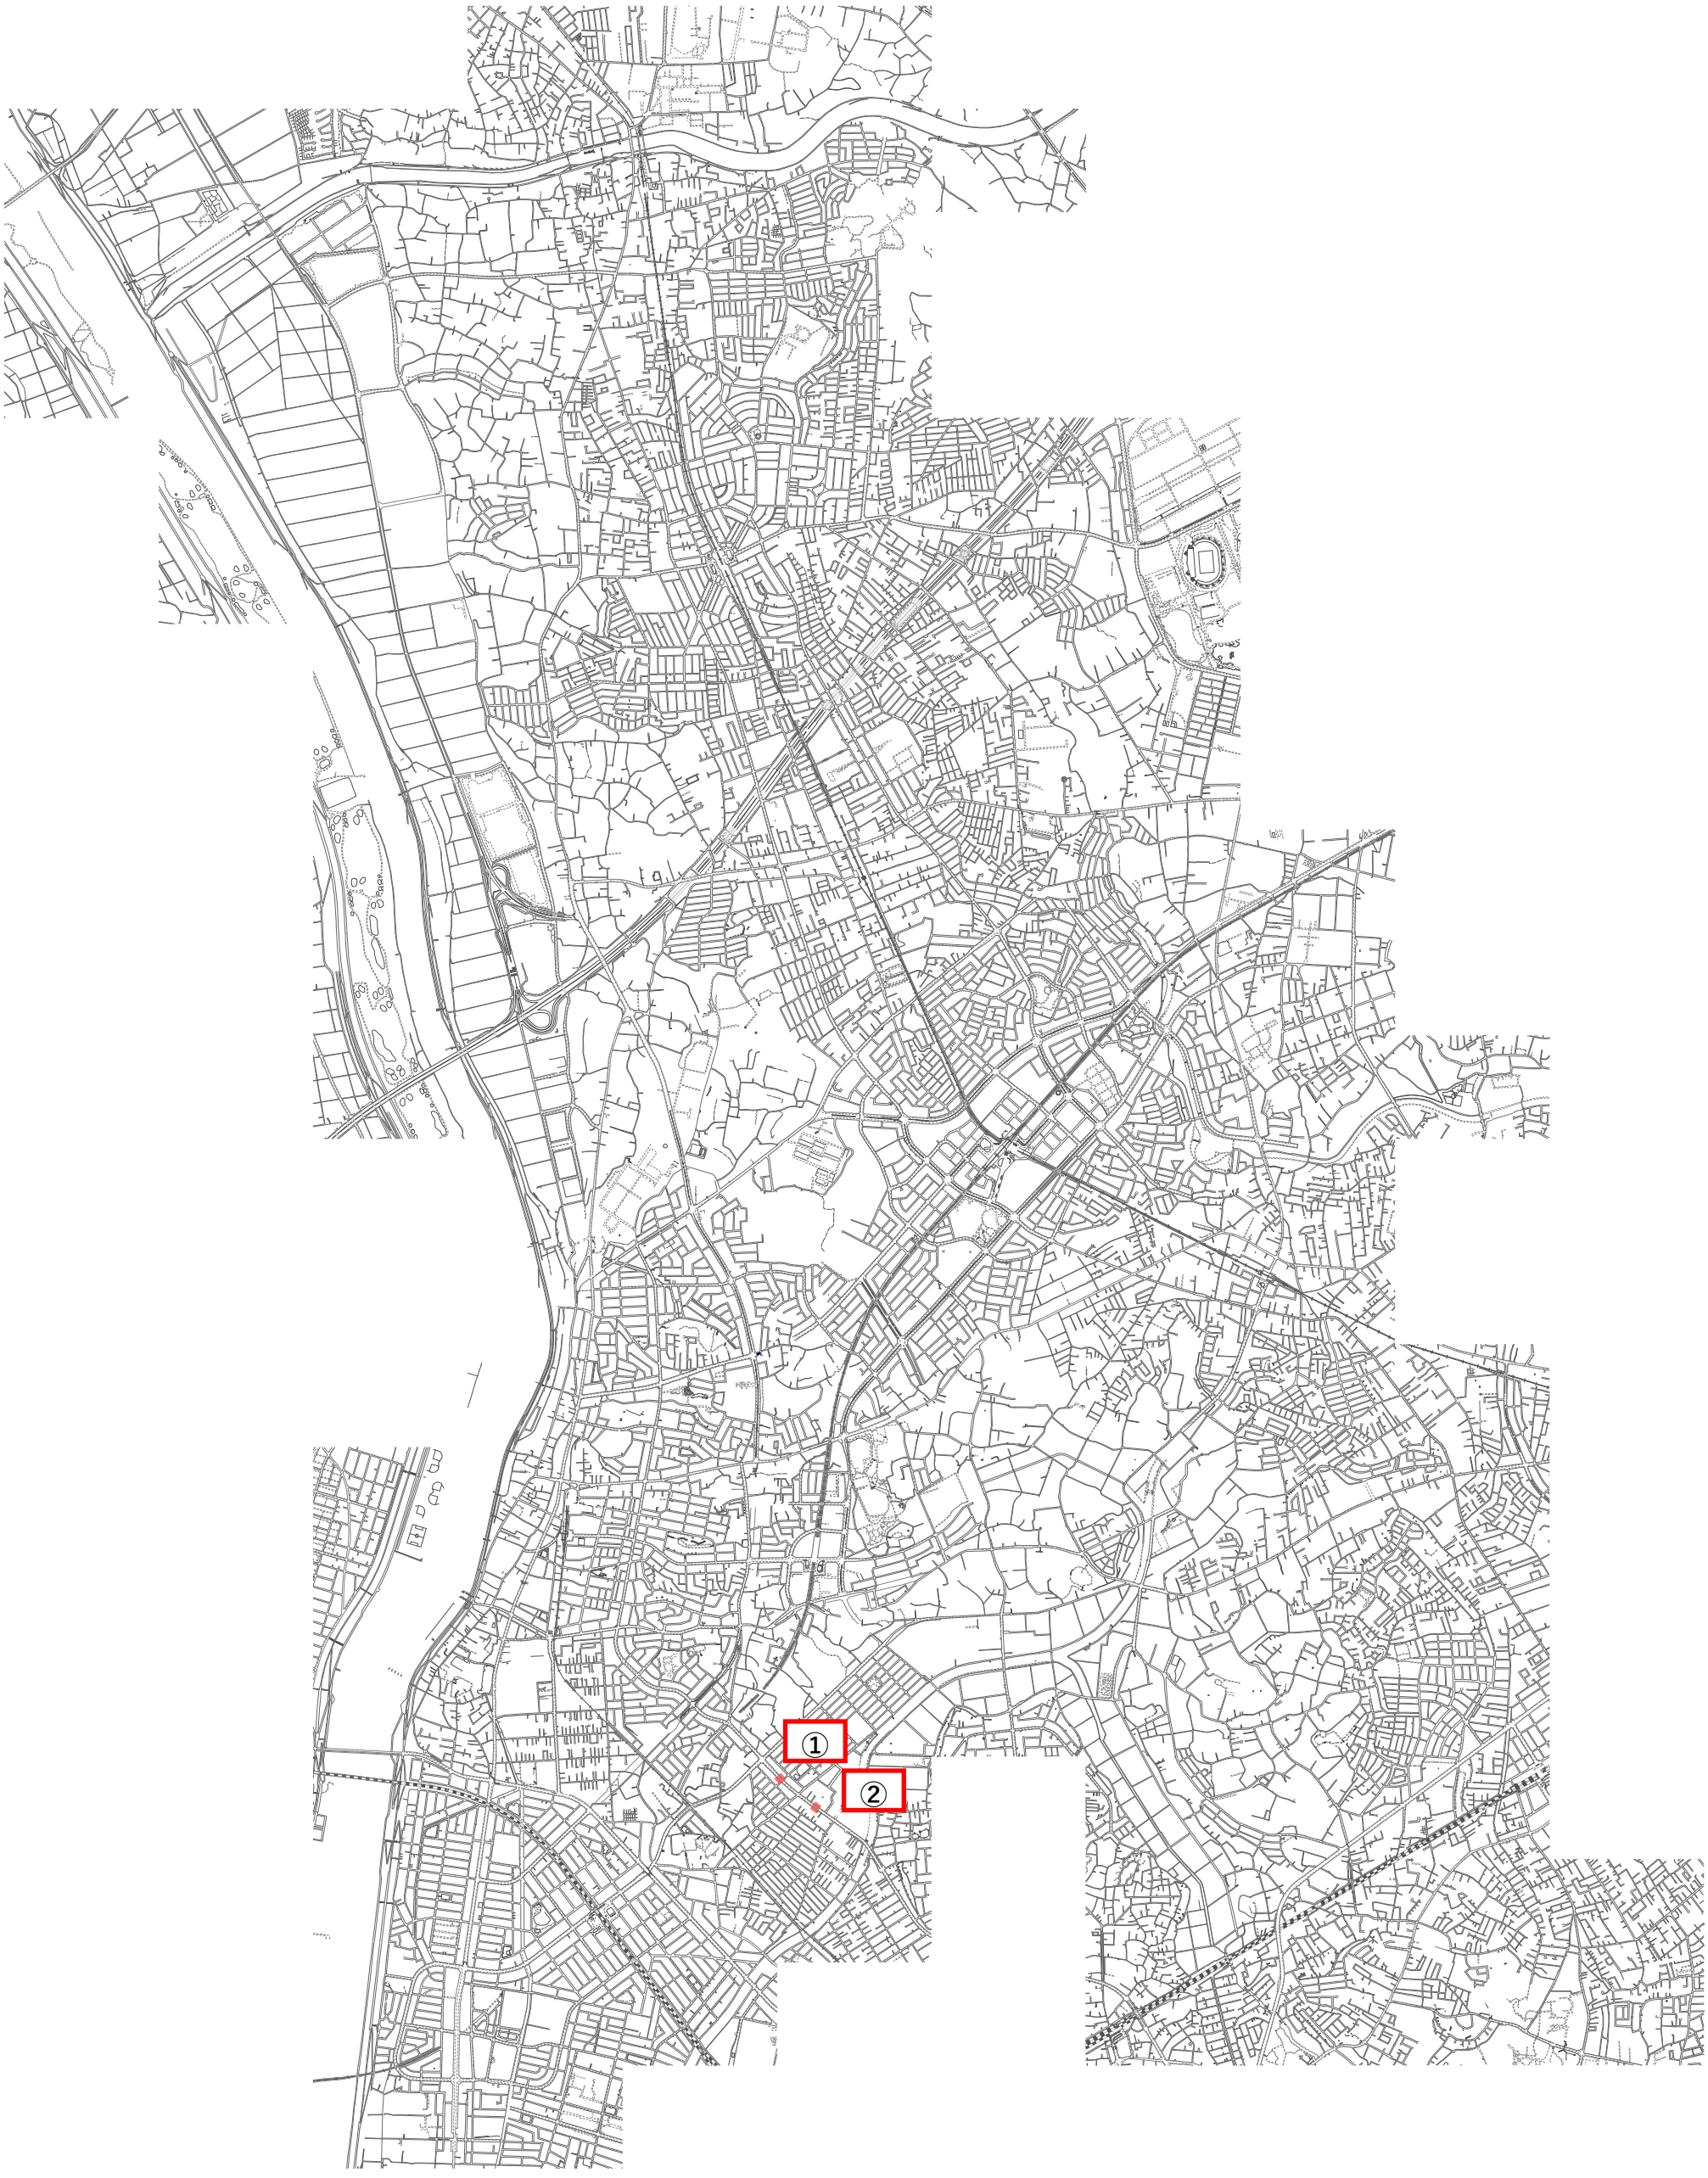

（様式４）

令和7年度下半期工事予定箇所図(北千葉広域水道企業団)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入　　例：(流山市役所道路管理課)
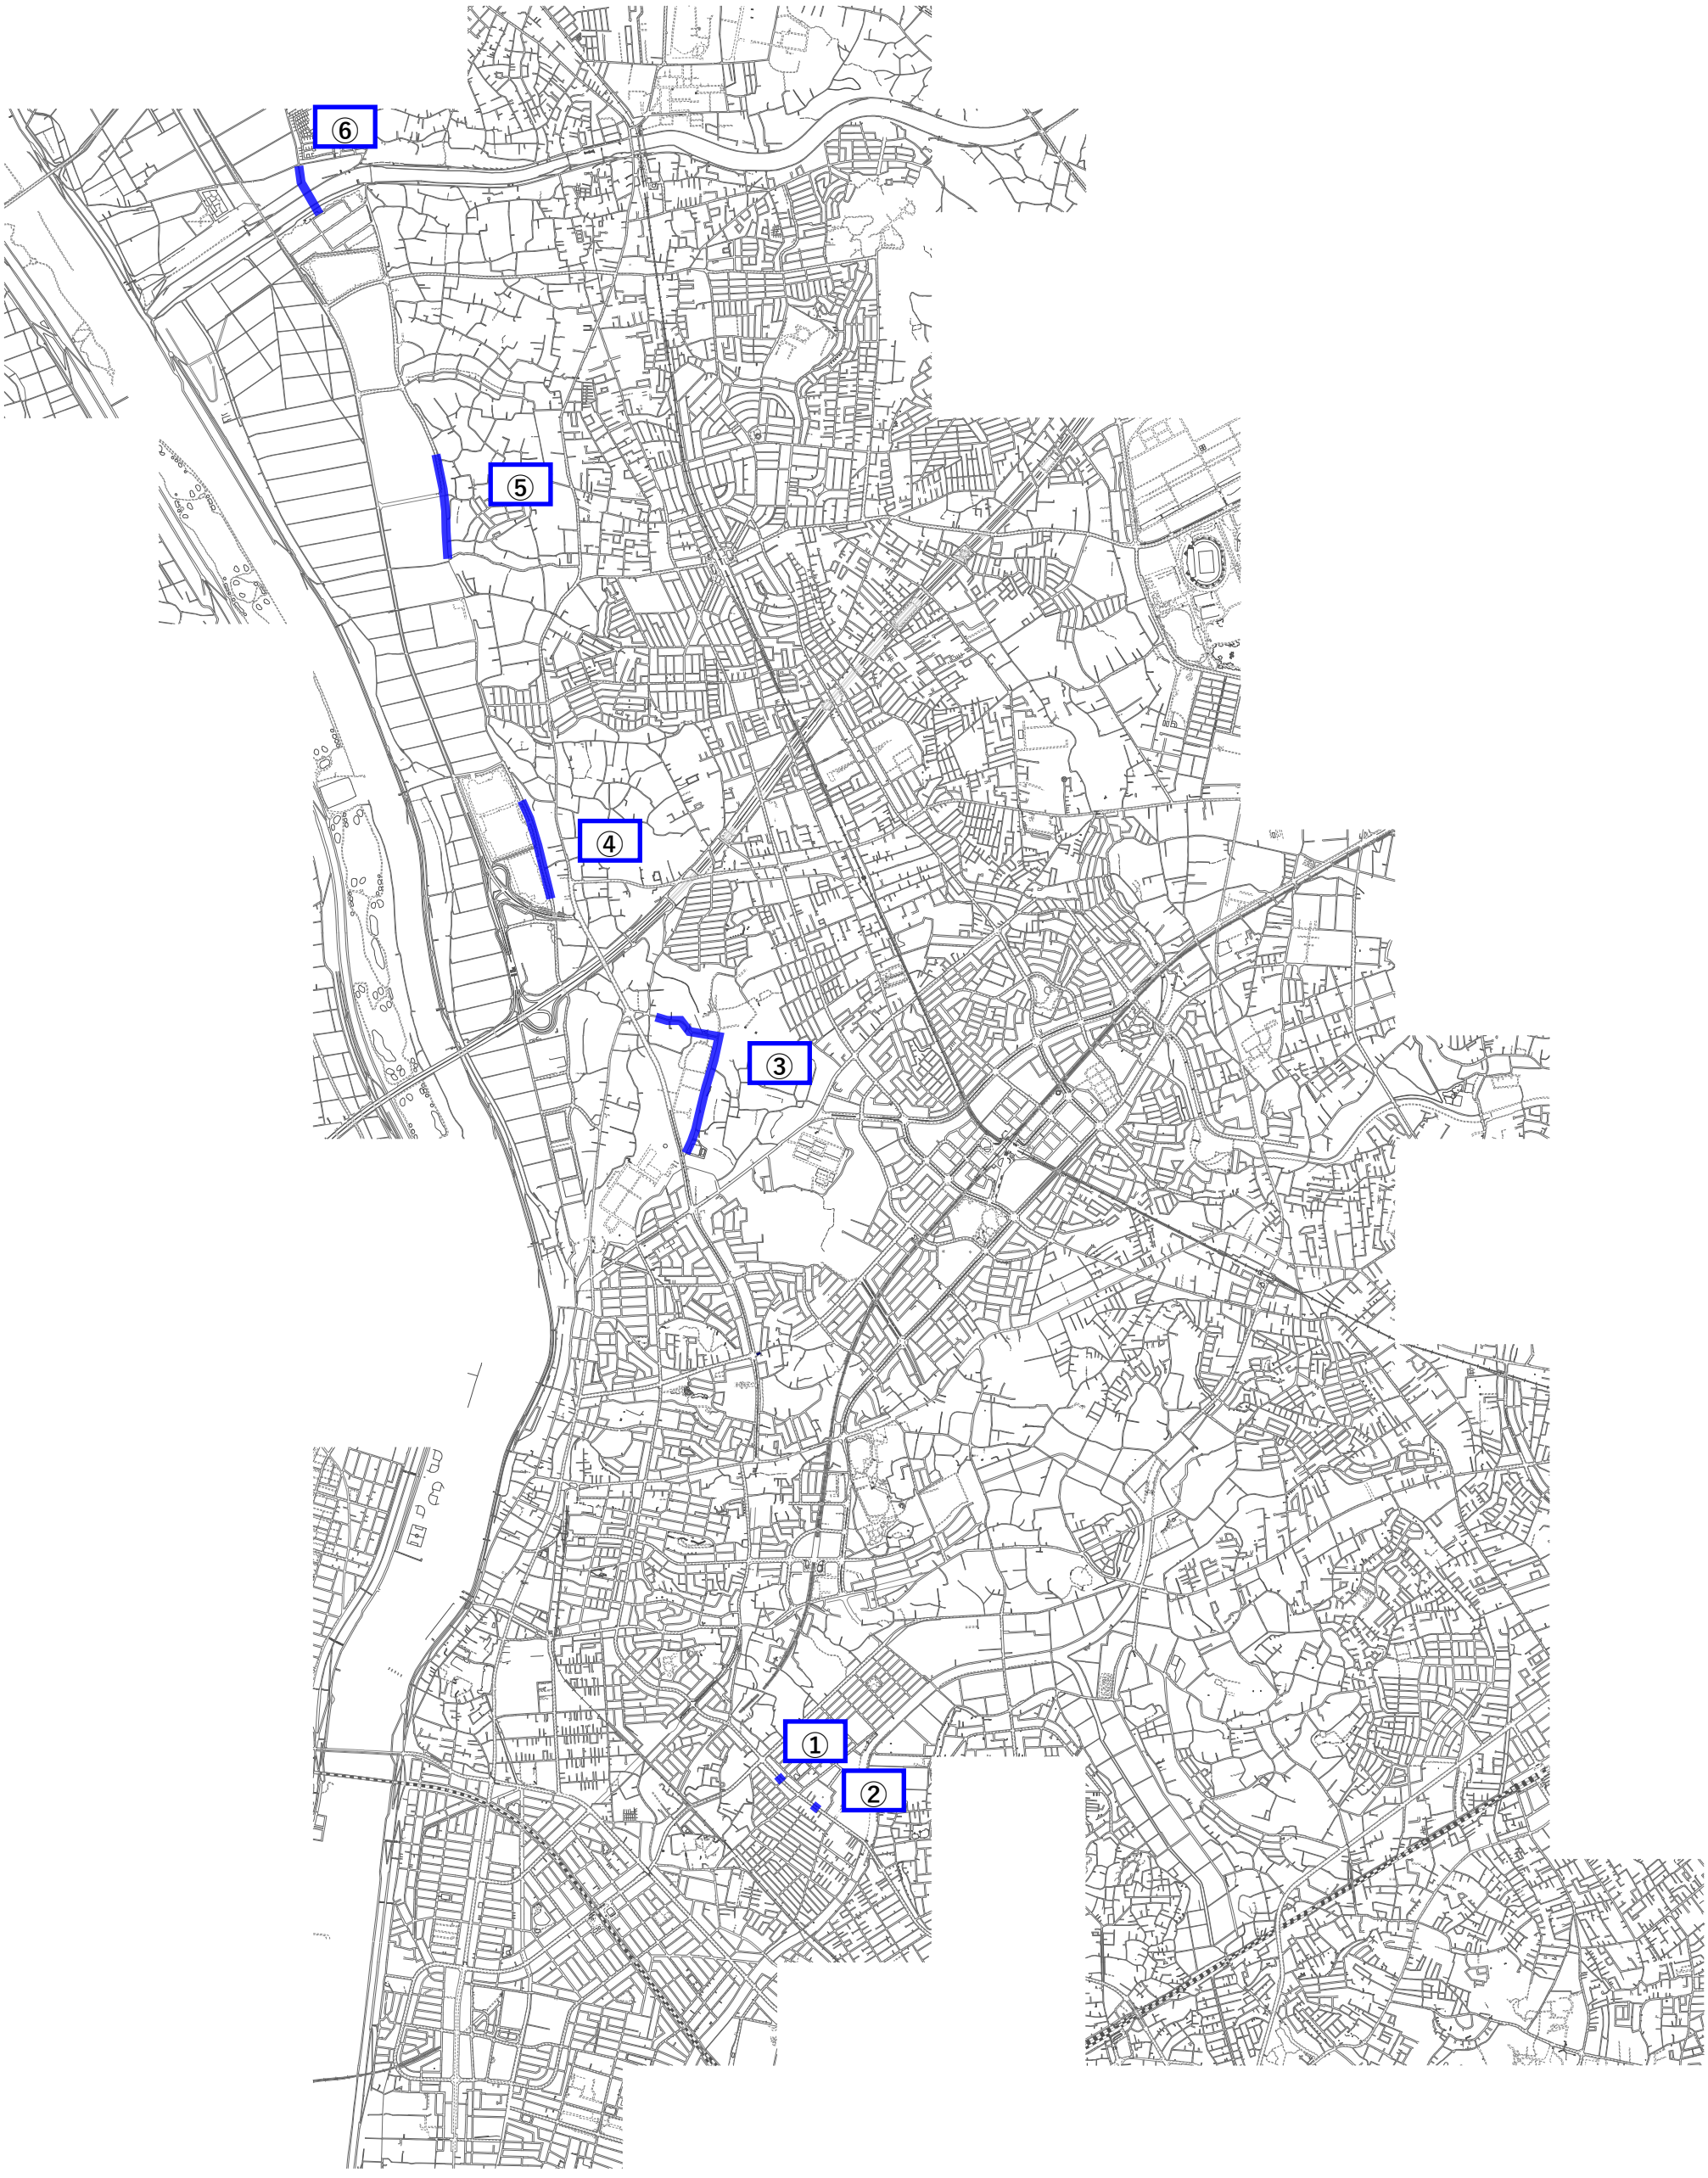
凡例	
━━	工事箇所
